개별 주택공급사업 추진현황 분석보고서

부천대장 A9

보고 기준일
2026-10-23

비교 기준
최초 유효 관리계획

분석 범위
사업 전체 분석 · 집계는 대표 관리범위

분석 관점
전체 추진현황

대표사업 ID
PRO_91a176954d241b2aac791074

원천 최종 수집
2026-10-22T13:16:14.078764+00:00

생성 시각
2026-10-23T05:05:50.111Z

핵심 요약

관리 사업량 574호 · 공공주택 · A9

사업화·인허가·착공 · 최근 등록 사건일 2026-06-30 (추정 포함 가능)

다음 등록 계획: 공급 2027년 하반기 · 574호

관리 확인 2건. 계획대로 진행 중인지 확정하려면 원천 사건과 비교 기준의 보완이 필요합니다.


붙임 1~4는 본문에 포함하지 않습니다. 화면 위의 '붙임 생성·다운로드'에서 별도로 받을 수 있습니다.

사업화부터 입주까지 단계별 진행

1 사업화	2 인허가	3 착공	4 준공	5 공급	6 입주
추정 포함	추정 포함	추정 포함	판정 미확보	추진 예정	판정 미확보
574호	**574호**	**574호**	**미확보**	**미확보**	**미확보**
2023-08-17	2026-06-30	2026-06-30	측정일 미확보	측정일 미확보	측정일 미확보
목표 574호	목표 574호	목표 574호	목표 미확보	목표 574호	목표 미확보
2023-08-17	2026-06-30	2026-06	일정 미확보	2027년 하반기	일정 미확보

각 단계의 관리 도달량과 목표를 함께 표시합니다. 추정 포함 여부를 구분하며 공급은 준공 전·후에 병행할 수 있습니다.

사업 단계별 목표·실적 일정 · 10년

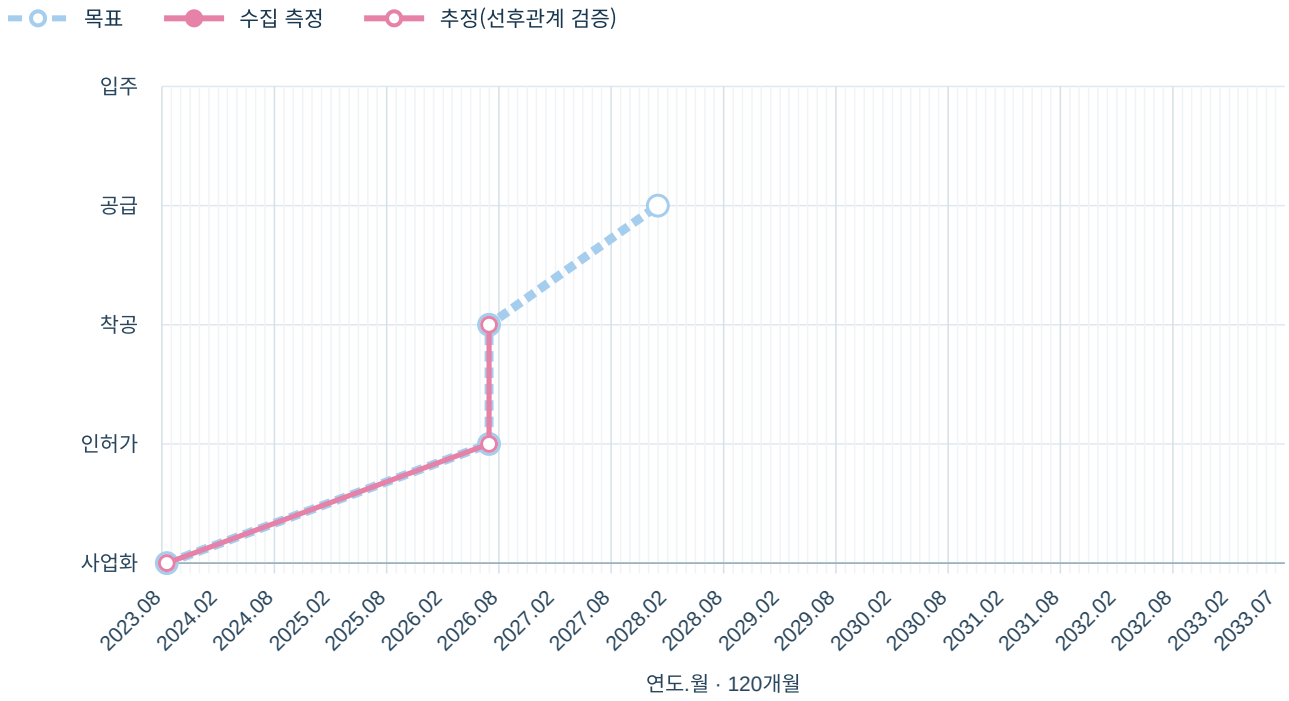

2023.08~2033.07 · 월 단위. 목표는 옅은 파랑, 분홍은 측정·추정값입니다. 분홍 ●는 수집 측정일, ○는 사건 선후관계를 검증해 해당 단계 목표값을 적용한 추정일입니다. 월·분기 원천은 원장에 보관된 축 배치용 날짜이며, 실제 날짜 정밀도는 일정 비교표와 붙임을 따릅니다.

1. 사업 개요 및 정책 연계현황

2. 사업 단계별 추진현황

3. 사업 추진일정 및 계획 대비 분석

4. 공급물량 및 주요 변경 이력

5. 인허가·행정절차 추진현황

6. 건설·분양·준공·입주 추진현황

7. 사업 위험요인 및 지연 영향 분석

8. 향후 주요 일정 및 조치 필요사항

9. 종합평가 및 정책관리 의견

분석 관점: 전체 추진현황 · 단계·물량·일정과 근거를 함께 확인합니다.

1. 사업 개요 및 정책 연계현황

☐ 대표사업 ID와 기존 정책 원장의 포함관계를 기준으로 분석했습니다. 지구명이 비슷한 별도 블록을 새로 합치지 않습니다.

사업 기본정보

구분	내용
대표사업	부천대장 A9 · PRO_91a176954d241b2aac791074
정책 / 프로그램	9·7 주택공급 확대방안 / LH 직접 시행 전환·토지이용 효율화
지역 / 블록	경기도 / 부천시 / A9
시행자 / 시공자	LH / 미확보
관리 사업량 / 공급유형	574호 / 공공주택 / 분양전환 공공임대
정책 합산 원장	정책 원장과 동일 대표사업
정책 연결 근거	담당자 대행 · 미연결 사업 재심사 사용자 지시 2026-10-19 · LH 2025.09.25 공식 발표의 9·7 후속 8개 블록 명단과 2025.10.30 제6차 공모를 대조. 부천대장 A9 / 분양전환 공공임대 / 574호 / 2026년 6월 착공 목표. 시도·지구·블록 및 개별 공모의 전체 건설호수 확인; 기존 전체 사업 원장에 동일 블록 없음. 보도자료 개략량보다 개별 공모 세부 명세를 관리 기준으로 채택. 실제 착공 여부는 별도 확인. https://www.lh.or.kr/gallery.es?act=view&bid=0003&list_no=111872&mid=a10502000000 · 세부 프로그램은 공모문에 명… (전체는 별도 붙임)
위치 근거	37.506303124, 126.782329576 · APPROXIMATE_AREA

2. 사업 단계별 추진현황

☐ 사업화·인허가·착공에 관리 도달량이 등록되어 있습니다. 일부 물량의 단계 도달은 사업 전체 완료를 뜻하지 않습니다.

단계별 관리 도달량과 근거 구성

단계 간 중복되는 누적량이므로 단계별 값을 합산하지 않습니다. 등록 채택은 기관 결재 확인과 다릅니다.

단계	전체 목표	관리 도달량	원천 / 채택	추정 / 후행 / 확인	상태
사업화	574호	574호	0호 / 0호	574호 / 0호 / 0호	관리 도달 · 추정 포함
인허가	574호	574호	0호 / 0호	574호 / 0호 / 0호	관리 도달 · 추정 포함
착공	574호	574호	0호 / 0호	574호 / 0호 / 0호	관리 도달 · 추정 포함
준공	미확보	미확보	0호 / 0호	0호 / 0호 / 0호	판정 미확보
공급	574호	미확보	0호 / 0호	0호 / 0호 / 0호	추진 예정
입주	미확보	미확보	0호 / 0호	0호 / 0호 / 0호	판정 미확보

3. 사업 추진일정 및 계획 대비 분석

□ 비교 기준: 최초 유효 관리계획. 기한 도래·자료 부재만으로 실제 지연을 확정하지 않습니다. 변경 원인과 후속 영향은 연결된 근거가 없으면 미확보로 표시합니다.

계획·실적 일정 비교

최초 유효 관리계획은 저장된 관리 기준선입니다. 최초 공식계획과 구분하며, 추정 일정·월/분기 자료·부분 물량에는 일 단위 지연을 계산하지 않습니다.

단계	비교 계획	현재 관리계획	등록 사건일	차이·비교 제한
사업화	2023-08-17	2023-08-17	2023-08-17 (추정)	동일 범위·정밀도 비교 불가
인허가	2026-06-30	2026-06-30	2026-06-30 (추정)	동일 범위·정밀도 비교 불가
착공	비교 기준 미확보	2026-06	2026-06-30 (추정)	동일 범위·정밀도 비교 불가
준공	비교 기준 미확보	미확보	미확보	동일 범위·정밀도 비교 불가
공급	비교 기준 미확보	2027년 하반기	미확보	동일 범위·정밀도 비교 불가
입주	비교 기준 미확보	미확보	미확보	동일 범위·정밀도 비교 불가

4. 공급물량 및 주요 변경 이력

□ 대표 관리물량 574호. 연결 원천 1개는 같은 사업의 근거이며 원천 호수의 합계가 사업 총량은 아닙니다.

○ 원천 판본의 차이와 공식 변경 승인을 구분합니다. 전체 변경 사유는 별도 붙임 3에 보존합니다.

원천별 물량·범위

원천	블록 / 유형	원천 계획량	채택 계획량	범위 근거
lh_policy_followup	A9 / 분양전환 공공임대	574호	574호	LH 2025.10.30 개별 공모의 블록 전체 건설호수 · 담당자 대행 채택

최근 주요 변경

등록일	항목	이전	이후	변경 사유
2026-10-22	관리값·단계·채택	{"BUSINESS":{"event_date":"2023-08-17","units":574,"input_rule":"TARGET_EQUALS_MISSING_MEASUREMENT",… (전체는 별도 붙임)	{"BUSINESS":{"event_date":"2023-08-17","units":574,"input_rule":"SEQUENCE_VALIDATED_TARGET_ESTIMATE"… (전체는 별도 붙임)	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
2026-10-22	관리값·단계·채택	{"BUSINESS":{"event_date":"2023-08-17","units":574,"input_rule":"OFFICER_PREDECESSOR_ESTIMATE","inpu… (전체는 별도 붙임)	{"BUSINESS":{"event_date":"2023-08-17","units":574,"input_rule":"TARGET_EQUALS_MISSING_MEASUREMENT",… (전체는 별도 붙임)	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정

등록일	항목	이전	이후	변경 사유
2026-10-20	status	미확보	CONFIRMED	담당자 확인 완료 - 비공식 자료: 이투데이 (2026-08-12), LH 상반기 민참 착공 보도 · 상반기 실제 착공을 확인한 자료로 분류. 기존 승인 사업·블록·호수와 대조하여 연결.정확한 착공일과 정부10월 발표 구성의 완전 동일성은 미확정.

원문에서 확인된 변경·관측 근거

이 표의 변경승인 총량은 해당 날짜의 신규 승인량 또는 최초 승인일이 아닙니다.

관측·고시 시점	단계 / 근거 구분	확인 물량	원문 확인 내용
2026-07-14까지 확인 · 발생일 미확보	인허가 / 변경승인 후 총량	574호	국토부 제2026-364호 2026.07.14: 부천대장 A9, 분양전환 공공임대, 대지 27,892㎡, 12개동의 사업규모를 568→574세대로 변경승인. API PER_659498cd3ee4d1ca7910c9da의 568호는 변경 전 값과 일치. 574호는 이 날짜까지 승인된 총량이며 최초 승인일·2026년 신규 승인량이 아니다. 실제 착공 확인 없음.

5. 인허가·행정절차 추진현황

□ 인허가, 사업계획 승인, 지구 지정은 각각의 원문 사건으로 확인해야 합니다. 후행 단계의 도달 추정은 해당 인허가 원문을 확보했다는 의미가 아닙니다.

연결된 행정절차 근거

단계	자료 종류	시점	사건·연결 근거
사업화	PLAN	2023-08-17	기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
사업화	ACTUAL	2023-08-17	사용자 입력 · 시스템 · 사용자 요청 기준 정정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
인허가	PLAN	2026-06-30	기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
인허가	ACTUAL	2026-06-30	사용자 입력 · 시스템 · 사용자 요청 기준 정정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정

6. 건설·분양·준공·입주 추진현황

□ 실제 관측 공정률: 미확보. 경과기간 또는 행정단계 수를 실제 공정률로 환산하지 않습니다.

○ 모집·공급량은 계약량과 다릅니다. 준공 또는 입주예정은 실제 입주가 아닙니다.

건설 이후 일정·도달량

단계	관리 도달량	등록 사건 시점	현재 계획	근거 구분
착공	574호	2026-06-30	2026-06	관리 도달 · 추정 포함
준공	미확보	미확보	미확보	판정 미확보
공급	미확보	미확보	2027년 하반기	추진 예정
입주	미확보	미확보	미확보	판정 미확보

단계	자료 종류	시점	사건·연결 근거
인허가	ACTUAL	2026-07-14까지 확인 · 발생일 미확보	국토부 제2026-364호 2026.07.14: 부천대장 A9, 분양전환 공공임대, 대지 27,892㎡, 12개동의 사업규모를 568→574세대로 변경승인. API PER_659498cd3ee4d1ca7910c9da의 568호는 변경 전 값과 일치. 574호는 이 날짜까지 승인된 총량이며 최초 승인일·2026년 신규 승인량이 아니다. 실제 착공 확인 없음. · 국토부 제2026-364호 2026.07.14: … (전체는 별도 붙임)

7. 사업 위험요인 및 지연 영향 분석

□ 위험 등급은 공식 지연 판정이 아닌 관리 확인 수준입니다. 기한 도래·자료 부재만으로 실제 지연을 확정하지 않습니다. 변경 원인과 후속 영향은 연결된 근거가 없으면 미확보로 표시합니다.

확인할 위험요인

대상 / 수준	근거	영향	필요 조치
원천 최신성 / 확인 필요	기존 원장의 STALE_SOURCE 표시 · 원천 기준일 30일 초과 기준	현재 현황과 관측시점 차이 가능	원천 기준일·공표일·수집일을 분리하여 최신 판본 확인
추정·선후관계 / 검토	관리 도달량에 추정 또는 후행 도달 근거 포함	원천 사건일·해당 물량의 직접 검증 필요	추정 사유를 유지하고 실제 사건 근거 추가 확인

8. 향후 주요 일정 및 조치 필요사항

□ 예정 일정은 등록된 계획의 정밀도와 범위를 유지합니다. 담당 기관·완료 기한이 지정되지 않은 조치는 제안으로 구분합니다.

시기별 주요 계획

기간	조회 종료일	계획 일정·물량
향후 1개월	2026-11-23	등록 일정 없음
향후 3개월	2027-01-23	등록 일정 없음
향후 6개월	2027-04-23	등록 일정 없음
연말	2026-12-31	등록 일정 없음

조치 관리 제안

조치	확인 대상	담당 / 기한	상태
원천 기준일·공표일·수집일을 분리하여 최신 판본 확인	원천 최신성	미지정 / 미확정	보고서 제안 · 공식 배정 아님
추정 사유를 유지하고 실제 사건 근거 추가 확인	추정·선후관계	미지정 / 미확정	보고서 제안 · 공식 배정 아님

9. 종합평가 및 정책관리 의견

□ 관리 확인 2건. 계획대로 진행 중인지 확정하려면 원천 사건과 비교 기준의 보완이 필요합니다.

○ 가장 최근 등록 변경: 2026-10-22 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정.

○ 우선 확인사항: 원천 최신성, 추정·선후관계. 원인·회복일정·실제 기관 승인 여부는 근거 확인 후 판단합니다.

HOME_PROJECT_BRIEF_V1_20261023 · SAMPLE-changed-plan · 입력 SHA-256
8c15254396b854d959e01ed6d2752ff9916c2f69f356c81f01113d3972318725
공식 기관 승인보고서가 아닌 저장 원장 기반 분석입니다.
