개별 주택공급사업 추진현황 분석보고서

고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구

보고 기준일
2026-10-23

비교 기준
최초 유효 관리계획

분석 범위
사업 전체 분석 · 집계는 대표 관리범위

분석 관점
전체 추진현황

대표사업 ID
PRO_4e0a46c41cc48a371a6fc916

원천 최종 수집
2026-10-22T16:51:09.901344+00:00

생성 시각
2026-10-23T05:05:50.031Z

핵심 요약

관리 사업량 869호 · 공공주택 · S-1

사업화·인허가·착공·공급 · 최근 등록 사건일 2025-06-30 (추정 포함 가능)

다음 등록 계획: 준공 2027-09-29 · 869호

관리 확인 2건. 계획대로 진행 중인지 확정하려면 원천 사건과 비교 기준의 보완이 필요합니다.


붙임 1~4는 본문에 포함하지 않습니다. 화면 위의 '붙임 생성·다운로드'에서 별도로 받을 수 있습니다.

사업화부터 입주까지 단계별 진행

1 사업화	2 인허가	3 착공	4 준공	5 공급	6 입주
추정 포함	추정 포함	추정 포함	추진 예정	실적 확인	추진 예정
869호	**869호**	**869호**	**미확보**	**869호**	**미확보**
2020-04-09	2023-02-21	2025-02-25	측정일 미확보	2025-06-30	측정일 미확보
목표 869호	목표 869호	목표 869호	목표 869호	목표 869호	목표 869호
2020-04-09	2023-02-21	2025-02-25	2027-09-29	2025-06-30	2028-03-31

각 단계의 관리 도달량과 목표를 함께 표시합니다. 추정 포함 여부를 구분하며 공급은 준공 전·후에 병행할 수 있습니다.

사업 단계별 목표·실적 일정 · 10년

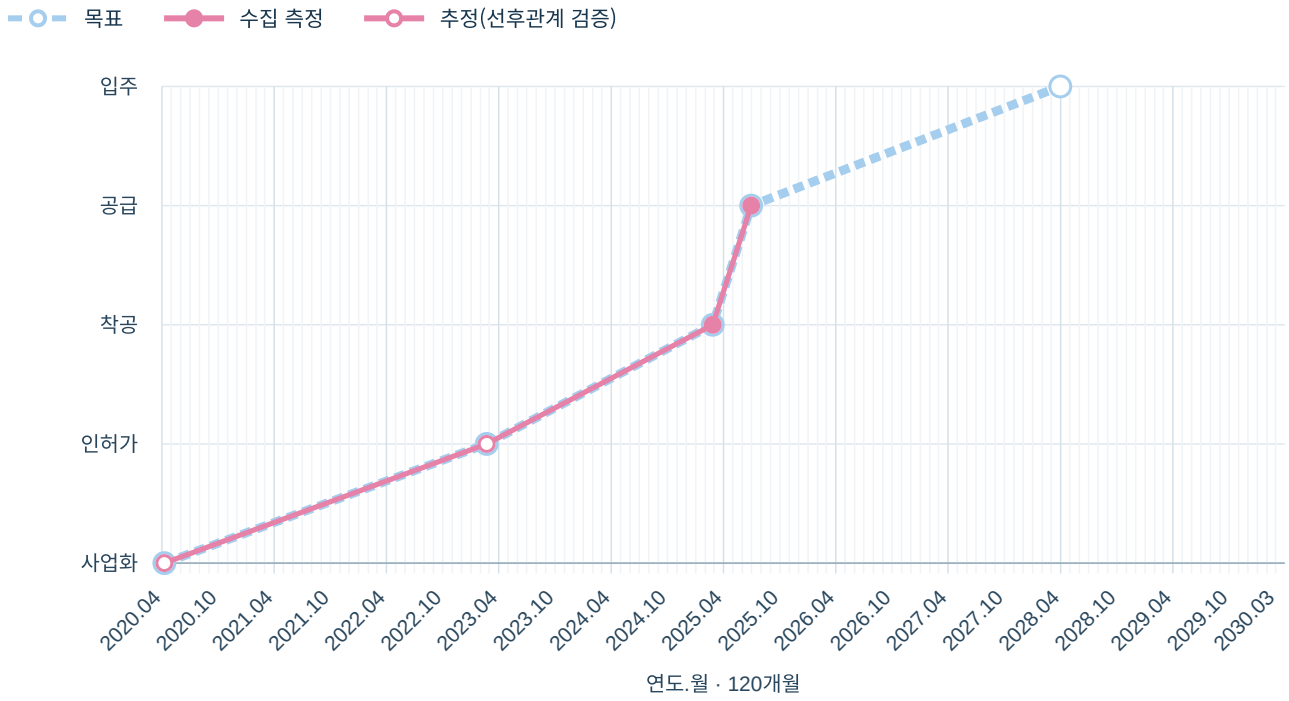

2020.04~2030.03 · 월 단위. 목표는 옅은 파랑, 분홍은 측정·추정값입니다. 분홍 ●는 수집 측정일, ○는 사건 선후관계를 검증해 해당 단계 목표값을 적용한 추정일입니다. 월·분기 원천은 원장에 보관된 축 배치용 날짜이며, 실제 날짜 정밀도는 일정 비교표와 붙임을 따릅니다.

1. 사업 개요 및 정책 연계현황

2. 사업 단계별 추진현황

3. 사업 추진일정 및 계획 대비 분석

4. 공급물량 및 주요 변경 이력

5. 인허가·행정절차 추진현황

6. 건설·분양·준공·입주 추진현황

7. 사업 위험요인 및 지연 영향 분석

8. 향후 주요 일정 및 조치 필요사항

9. 종합평가 및 정책관리 의견

분석 관점: 전체 추진현황 · 단계·물량·일정과 근거를 함께 확인합니다.

1. 사업 개요 및 정책 연계현황

□ 대표사업 ID와 기존 정책 원장의 포함관계를 기준으로 분석했습니다. 지구명이 비슷한 별도 블록을 새로 합치지 않습니다.

사업 기본정보

구분	내용
대표사업	고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 · PRO_4e0a46c41cc48a371a6fc916
정책 / 프로그램	9·7 주택공급 확대방안 / 공공주택 건설
지역 / 블록	경기도 / 고양시 / S-1
시행자 / 시공자	LH / 계룡건설산업 주식회사
관리 사업량 / 공급유형	869호 / 공공주택 / 유형 확인 필요
정책 합산 원장	정책 원장과 동일 대표사업
정책 연결 근거	사용자 입력 · 김민 · 자동매칭 확인 완료
위치 근거	37.648914311, 126.748688246 · DISTRICT_REPRESENTATIVE

2. 사업 단계별 추진현황

□ 사업화·인허가·착공·공급에 관리 도달량이 등록되어 있습니다. 일부 물량의 단계 도달은 사업 전체 완료를 뜻하지 않습니다.

단계별 관리 도달량과 근거 구성

단계 간 중복되는 누적량이므로 단계별 값을 합산하지 않습니다. 등록 채택은 기관 결재 확인과 다릅니다.

단계	전체 목표	관리 도달량	원천 / 채택	추정 / 후행 / 확인	상태
사업화	869호	869호	0호 / 0호	869호 / 0호 / 0호	관리 도달 · 추정 포함
인허가	869호	869호	0호 / 0호	869호 / 0호 / 0호	관리 도달 · 추정 포함
착공	869호	869호	0호 / 0호	869호 / 0호 / 0호	관리 도달 · 추정 포함
준공	869호	미확보	0호 / 0호	0호 / 0호 / 0호	추진 예정
공급	869호	869호	0호 / 869호	0호 / 0호 / 0호	도달 근거 확보
입주	869호	미확보	0호 / 0호	0호 / 0호 / 0호	추진 예정

3. 사업 추진일정 및 계획 대비 분석

□ 비교 기준: 최초 유효 관리계획. 기한 도래·자료 부재만으로 실제 지연을 확정하지 않습니다. 변경 원인과 후속 영향은 연결된 근거가 없으면 미확보로 표시합니다.

계획·실적 일정 비교

최초 유효 관리계획은 저장된 관리 기준선입니다. 최초 공식계획과 구분하며,

4. 공급물량 및 주요 변경 이력

□ 대표 관리물량 869호. 연결 원천 1개는 같은 사업의 근거이며 원천 호수의 합계가 사업 총량은 아닙니다.

○ 원천 판본의 차이와 공식 변경 승인을 구분합니다. 전체 변경 사유는 별도 붙임 3에 보존합니다.

추정 일정·월/분기 자료·부분 물량에는 일 단위 지연을 계산하지 않습니다.

단계	비교 계획	현재 관리계획	등록 사건일	차이·비교 제한
사업화	2025-02-25	2020-04-09	2020-04-09 (추정)	동일 범위·정밀도 비교 불가
인허가	2025-02-25	2023-02-21	2023-02-21 (추정)	동일 범위·정밀도 비교 불가
착공	2025-02-25	2025-02-25	2025-02-25	0일 · 현재 계획일 – 비교 계획일
준공	2028-03-31	2027-09-29	미확보	동일 범위·정밀도 비교 불가
공급	2025-06-30	2025-06-30	2025-06-30	동일 범위·정밀도 비교 불가
입주	2028-03-31	2028-03-31	미확보	0일 · 현재 계획일 – 비교 계획일

원천별 물량·범위

원천	블록 / 유형	원천 계획량	채택 계획량	범위 근거
lh_construction	S-1 / 유형 확인 필요	869호	869호	건축공사 규모 (호)

최근 주요 변경

등록일	항목	이전	이후	변경 사유
2026-10-22	관리값·단계·채택	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2020-04-09","units":869,"calculation":{"construction":{"days":… (전체는 별도 붙임)	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2020-04-09","units":869,"calculation":{"construction":{"days":… (전체는 별도 붙임)	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
2026-10-22	관리값·단계·채택	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2020-04-09","units":869,"calculation":{"construction":{"days":… (전체는 별도 붙임)	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2020-04-09","units":869,"calculation":{"construction":{"days":… (전체는 별도 붙임)	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
2026-10-14	관리값·단계·채택	{"mapping":{"before":{"policy_id":"POL_2025_0907","program_id":"PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29","statu… (전체는 별도 붙임)	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2020-04-09","units":869,"calculation":{"construction":{"days":… (전체는 별도 붙임)	자동매칭 확인 완료
2026-10-14	due_date	2028-03-31	2027-09-29	자동매칭 확인 완료

등록일	항목	이전	이후	변경 사유
2026-10-14	due_date	2025-02-25	2023-02-21	자동매칭 확인 완료
2026-10-14	due_date	2025-02-25	2020-04-09	자동매칭 확인 완료

원문에서 확인된 변경·관측 근거

이 표의 변경승인 총량은 해당 날짜의 신규 승인량 또는 최초 승인일이 아닙니다.

선택 원장·조건에 해당하는 행이 없습니다. 자료 부재가 실적 0을 뜻하지 않습니다.

5. 인허가·행정절차 추진현황

□ 인허가, 사업계획 승인, 지구 지정은 각각의 원문 사건으로 확인해야 합니다. 후행 단계의 도달 추정은 해당 인허가 원문을 확보했다는 의미가 아닙니다.

연결된 행정절차 근거

단계	자료 종류	시점	사건·연결 근거
사업화	STATE	2025-02-25	담당자 확인 · 김민 · 자동매칭 확인 완료 · 공식 착공 기록의 선행 단계 도달 추정 · 사업화·허가 원문 및 사건일 확인 필요
사업화	PLAN	2020-04-09	자동매칭 확인 완료
사업화	ACTUAL	2020-04-09	사용자 입력 · 시스템 · 사용자 요청 기준 정정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
인허가	STATE	2025-02-25	담당자 확인 · 김민 · 자동매칭 확인 완료 · 공식 착공 기록의 선행 단계 도달 추정 · 사업화·허가 원문 및 사건일 확인 필요
인허가	PLAN	2023-02-21	자동매칭 확인 완료

6. 건설·분양·준공·입주 추진현황

□ 실제 관측 공정률: 40.99% · 2026-10-01 · lh_progress. 경과기간 또는 행정단계 수를 실제 공정률로 환산하지 않습니다.

○ 모집·공급량은 계약량과 다릅니다. 준공 또는 입주예정은 실제 입주가 아닙니다.

건설 이후 일정·도달량

단계	관리 도달량	등록 사건 시점	현재 계획	근거 구분
착공	869호	2025-02-25	2025-02-25	관리 도달 · 추정 포함
준공	미확보	미확보	2027-09-29	추진 예정
공급	869호	2025-06-30	2025-06-30	도달 근거 확보
입주	미확보	미확보	2028-03-31	추진 예정

단계	자료 종류	시점	사건·연결 근거
인허가	ACTUAL	2023-02-21	사용자 입력 · 시스템 · 사용자 요청 기준 정정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정

7. 사업 위험요인 및 지연 영향 분석

□ 위험 등급은 공식 지연 판정이 아닌 관리 확인 수준입니다. 기한 도래·자료 부재만으로 실제 지연을 확정하지 않습니다. 변경 원인과 후속 영향은 연결된 근거가 없으면 미확보로 표시합니다.

확인할 위험요인

대상 / 수준	근거	영향	필요 조치
원천 최신성 / 확인 필요	기존 원장의 STALE_SOURCE 표시 · 원천 기준일 30일 초과 기준	현재 현황과 관측시점 차이 가능	원천 기준일·공표일·수집일을 분리하여 최신 판본 확인
추정·선후관계 / 검토	관리 도달량에 추정 또는 후행 도달 근거 포함	원천 사건일·해당 물량의 직접 검증 필요	추정 사유를 유지하고 실제 사건 근거 추가 확인

8. 향후 주요 일정 및 조치 필요사항

□ 예정 일정은 등록된 계획의 정밀도와 범위를 유지합니다. 담당 기관·완료 기한이 지정되지 않은 조치는 제안으로 구분합니다.

시기별 주요 계획

기간	조회 종료일	계획 일정·물량
향후 1개월	2026-11-23	등록 일정 없음
향후 3개월	2027-01-23	등록 일정 없음
향후 6개월	2027-04-23	등록 일정 없음
연말	2026-12-31	등록 일정 없음

조치 관리 제안

조치	확인 대상	담당 / 기한	상태
원천 기준일·공표일·수집일을 분리하여 최신 판본 확인	원천 최신성	미지정 / 미확정	보고서 제안 · 공식 배정 아님
추정 사유를 유지하고 실제 사건 근거 추가 확인	추정·선후관계	미지정 / 미확정	보고서 제안 · 공식 배정 아님

9. 종합평가 및 정책관리 의견

□ 관리 확인 2건. 계획대로 진행 중인지 확정하려면 원천 사건과 비교 기준의 보완이 필요합니다.

○ 가장 최근 등록 변경: 2026-10-22 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정.

○ 우선 확인사항: 원천 최신성, 추정·선후관계. 원인·회복일정·실제 기관 승인 여부는 근거 확인 후 판단합니다.

HOME_PROJECT_BRIEF_V1_20261023 · SAMPLE-observed-construction · 입력 SHA-256 d465b433adc644be405b90b5d9b80ca61001abfcf25acb09691568c3a3f93144
공식 기관 승인보고서가 아닌 저장 원장 기반 분석입니다.
