개별 주택공급사업 추진현황 분석보고서

과천주암(뉴스테이) C2

보고 기준일
2026-10-23

비교 기준
최초 유효 관리계획

분석 범위
사업 전체 분석 · 집계는 대표 관리범위

분석 관점
전체 추진현황

대표사업 ID
PRO_bceb35af2280eaa50c810c09

원천 최종 수집
2026-10-22T16:51:09.901344+00:00

생성 시각
2026-10-23T05:05:50.154Z

핵심 요약

관리 사업량 344호 · 공공주택 · C2

사업화·인허가·착공 · 최근 등록 사건일 2024-12-31 (추정 포함 가능)

다음 등록 계획: 준공 2027-10-11 · 344호

관리 확인 4건. 계획대로 진행 중인지 확정하려면 원천 사건과 비교 기준의 보완이 필요합니다.


붙임 1~4는 본문에 포함하지 않습니다. 화면 위의 '붙임 생성·다운로드'에서 별도로 받을 수 있습니다.

사업화부터 입주까지 단계별 진행

1 사업화	2 인허가	3 착공	4 준공	5 공급	6 입주
추정 포함	실적 확인	추정 포함	추진 예정	판정 미확보	추진 예정
344호	**344호**	**344호**	**미확보**	**미확보**	**미확보**
2018-02-15	2020-12-29	2024-12-31	측정일 미확보	측정일 미확보	측정일 미확보
목표 344호	목표 344호	목표 344호	목표 344호	목표 344호	목표 344호
2018-02-15	2020-12-29	2024-12-31	2027-10-11	2025-11-16	2028-04-12

각 단계의 관리 도달량과 목표를 함께 표시합니다. 추정 포함 여부를 구분하며 공급은 준공 전·후에 병행할 수 있습니다.

사업 단계별 목표·실적 일정 · 10년

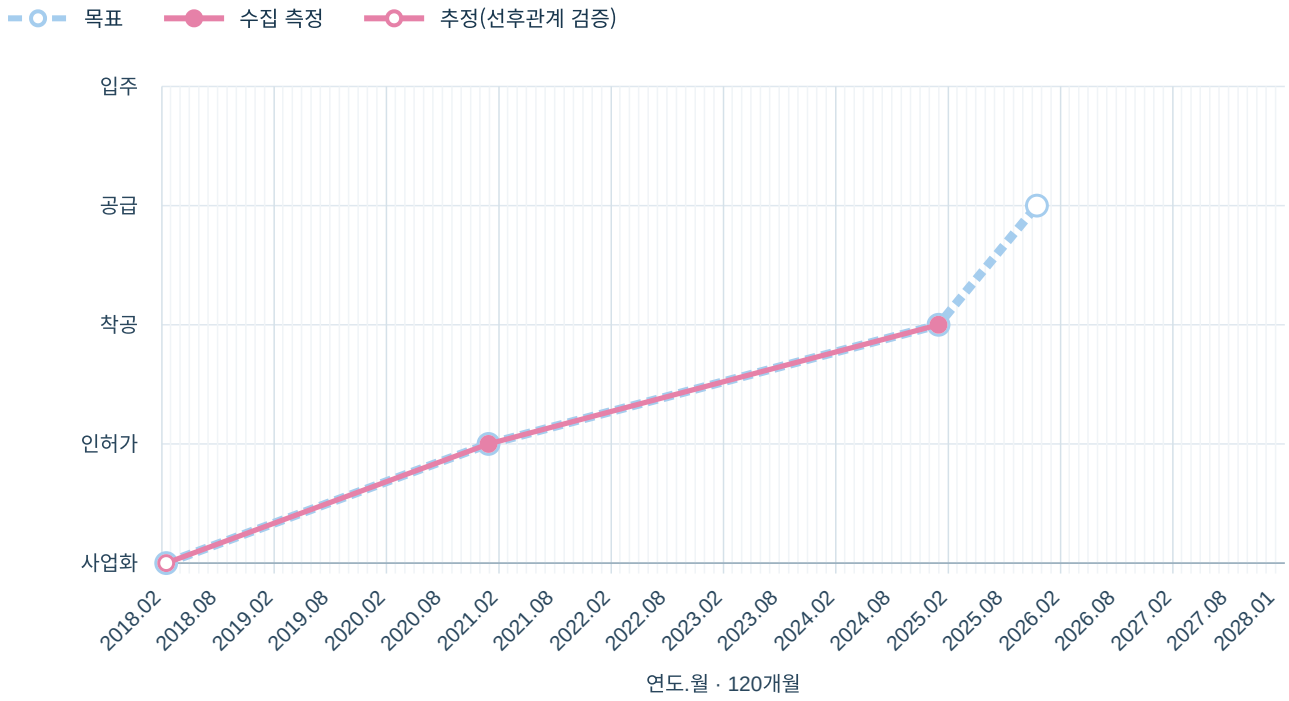

2018.02~2028.01 · 월 단위. 목표는 옅은 파랑, 분홍은 측정·추정값입니다. 분홍 ●는 수집 측정일, ○는 사건 선후관계를 검증해 해당 단계 목표값을 적용한 추정일입니다. 월·분기 원천은 원장에 보관된 축 배치용 날짜이며, 실제 날짜 정밀도는 일정 비교표와 붙임을 따릅니다.

1. 사업 개요 및 정책 연계현황

2. 사업 단계별 추진현황

3. 사업 추진일정 및 계획 대비 분석

4. 공급물량 및 주요 변경 이력

5. 인허가·행정절차 추진현황

6. 건설·분양·준공·입주 추진현황

7. 사업 위험요인 및 지연 영향 분석

8. 향후 주요 일정 및 조치 필요사항

9. 종합평가 및 정책관리 의견

분석 관점: 전체 추진현황 · 단계·물량·일정과 근거를 함께 확인합니다.

1. 사업 개요 및 정책 연계현황

□ 대표사업 ID와 기존 정책 원장의 포함관계를 기준으로 분석했습니다. 지구명이 비슷한 별도 블록을 새로 합치지 않습니다.

사업 기본정보

구분	내용
대표사업	과천주암(뉴스테이) C2 · PRO_bceb35af2280eaa50c810c09
정책 / 프로그램	9·7 주택공급 확대방안 / 건설형 공공임대
지역 / 블록	경기도 / 과천시 / C2
시행자 / 시공자	LH / 양우건설 주식회사
관리 사업량 / 공급유형	344호 / 공공주택 / 행복주택
정책 합산 원장	정책 원장과 동일 대표사업
정책 연결 근거	사용자 입력 · 김민 · 자동매칭 확인 완료
위치 근거	37.4528123356255, 127.02028533070951 · APPROXIMATE_AREA

2. 사업 단계별 추진현황

□ 사업화·인허가·착공에 관리 도달량이 등록되어 있습니다. 일부 물량의 단계 도달은 사업 전체 완료를 뜻하지 않습니다.

단계별 관리 도달량과 근거 구성

단계 간 중복되는 누적량이므로 단계별 값을 합산하지 않습니다. 등록 채택은 기관 결재 확인과 다릅니다.

단계	전체 목표	관리 도달량	원천 / 채택	추정 / 후행 / 확인	상태
사업화	344호	344호	0호 / 0호	344호 / 0호 / 0호	관리 도달 · 추정 포함
인허가	344호	344호	0호 / 344호	0호 / 0호 / 0호	도달 근거 확보
착공	344호	344호	0호 / 0호	344호 / 0호 / 0호	관리 도달 · 추정 포함
준공	344호	미확보	0호 / 0호	0호 / 0호 / 0호	추진 예정
공급	344호	미확보	0호 / 0호	0호 / 0호 / 0호	기한 도래 · 실적 확인 필요
입주	344호	미확보	0호 / 0호	0호 / 0호 / 0호	추진 예정

3. 사업 추진일정 및 계획 대비 분석

□ 비교 기준: 최초 유효 관리계획. 기한 도래·자료 부재만으로 실제 지연을 확정하지 않습니다. 변경 원인과 후속 영향은 연결된 근거가 없으면 미확보로 표시합니다.

계획·실적 일정 비교

최초 유효 관리계획은 저장된 관리 기준선입니다. 최초 공식계획과 구분하며,

4. 공급물량 및 주요 변경 이력

□ 대표 관리물량 344호. 연결 원천 2개는 같은 사업의 근거이며 원천 호수의 합계가 사업 총량은 아닙니다.

○ 원천 판본의 차이와 공식 변경 승인을 구분합니다. 전체 변경 사유는 별도 붙임 3에 보존합니다.

추정 일정·월/분기 자료·부분 물량에는 일 단위 지연을 계산하지 않습니다.

단계	비교 계획	현재 관리계획	등록 사건일	차이·비교 제한
사업화	2020-12-29	2018-02-15	2018-02-15 (추정)	동일 범위·정밀도 비교 불가
인허가	2020-12-29	2020-12-29	2020-12-29	0일 · 원천 사건일 – 비교 계획일
착공	2024-12-31	2024-12-31	2024-12-31	동일 범위·정밀도 비교 불가
준공	2027-10-11	2027-10-11	미확보	동일 범위·정밀도 비교 불가
공급	2025-06-29	2025-11-16	미확보	동일 범위·정밀도 비교 불가
입주	2028-01-31	2028-04-12	미확보	동일 범위·정밀도 비교 불가

원천별 물량·범위

원천	블록 / 유형	원천 계획량	채택 계획량	범위 근거
lh_rent	C2 / 행복주택	344호	344호	임대 공급계획 호수
lh_construction	C2 / 유형 확인 필요	1,030호	1,030호	건축공사 규모 (호)

최근 주요 변경

등록일	항목	이전	이후	변경 사유
2026-10-22	관리값·단계·채택	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2018-02-15","units":1030,"calculation":{"construction":{"days"… (전체는 별도 붙임)	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2018-02-15","units":1030,"calculation":{"construction":{"days"… (전체는 별도 붙임)	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
2026-10-22	관리값·단계·채택	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2018-02-15","units":344,"calculation":{"construction":{"days":… (전체는 별도 붙임)	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2018-02-15","units":344,"calculation":{"construction":{"days":… (전체는 별도 붙임)	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
2026-10-22	관리값·단계·채택	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2018-02-15","units":1030,"calculation":{"construction":{"days"… (전체는 별도 붙임)	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2018-02-15","units":1030,"calculation":{"construction":{"days"… (전체는 별도 붙임)	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정

등록일	항목	이전	이후	변경 사유
2026-10-22	관리값·단계·채택	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2018-02-15","units":344,"calculation":{"construction":{"days":… (전체는 별도 붙임)	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2018-02-15","units":344,"calculation":{"construction":{"days":… (전체는 별도 붙임)	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
2026-10-14	관리값·단계·채택	{"mapping":{"before":{"policy_id":"POL_2025_0907","program_id":"PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29","statu… (전체는 별도 붙임)	{"schedules":{"BUSINESS":{"due_date":"2018-02-15","units":1030,"calculation":{"construction":{"days"… (전체는 별도 붙임)	자동매칭 확인 완료
2026-10-14	due_date	2028-01-31	2028-04-12	자동매칭 확인 완료

원문에서 확인된 변경·관측 근거

이 표의 변경승인 총량은 해당 날짜의 신규 승인량 또는 최초 승인일이 아닙니다.

선택 원장·조건에 해당하는 행이 없습니다. 자료 부재가 실적 0을 뜻하지 않습니다.

5. 인허가·행정절차 추진현황

□ 인허가, 사업계획 승인, 지구 지정은 각각의 원문 사건으로 확인해야 합니다. 후행 단계의 도달 추정은 해당 인허가 원문을 확보했다는 의미가 아닙니다.

6. 건설·분양·준공·입주 추진현황

□ 실제 관측 공정률: 31.88% · 2026-09-29 · lh_progress. 경과기간 또는 행정단계 수를 실제 공정률로 환산하지 않습니다.

○ 모집·공급량은 계약량과 다릅니다. 준공 또는 입주예정은 실제 입주가 아닙니다.

건설 이후 일정·도달량

단계	관리 도달량	등록 사건 시점	현재 계획	근거 구분
착공	344호	2024-12-31	2024-12-31	관리 도달 · 추정 포함

연결된 행정절차 근거

단계	자료 종류	시점	사건·연결 근거
사업화	STATE	2026-01-01	담당자 확인 · 김민 · 자동매칭 확인 완료 · 공식 사업별 공급계획에 식별된 사업 · 사업화 상태 확인 필요 · 사건일 미확보
사업화	PLAN	2018-02-15	자동매칭 확인 완료
사업화	ACTUAL	2018-02-15	사용자 입력 · 시스템 · 사용자 요청 기준 정정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
인허가	ACTUAL	2020-12-29	담당자 확인 · 김민 · 자동매칭 확인 완료 · 동일 지구·단일 블록 (명칭 부가표기 정규화) · 건축HUB 원천 허가일 · 사업 344호 / 승인 원천 1,030호; 전체·부분 관계 후보, 담당자 확인 필요
인허가	PLAN	2020-12-29	자동매칭 확인 완료
인허가	ACTUAL	2020-12-29	사용자 입력 · 시스템 · 사용자 요청 기준 정정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정

단계	관리 도달량	등록 사건 시점	현재 계획	근거 구분
준공	미확보	미확보	2027-10-11	추진 예정
공급	미확보	미확보	2025-11-16	기한 도래 · 실적 확인 필요
입주	미확보	미확보	2028-04-12	추진 예정

7. 사업 위험요인 및 지연 영향 분석

□ 위험 등급은 공식 지연 판정이 아닌 관리 확인 수준입니다. 기한 도래·자료 부재만으로 실제 지연을 확정하지 않습니다. 변경 원인과 후속 영향은 연결된 근거가 없으면 미확보로 표시합니다.

확인할 위험요인

대상 / 수준	근거	영향	필요 조치
공급 / 확인 필요	344호 도래 목표 / 미확보 관리 도달	실제 이행 및 후속 일정 영향 미확정	동일 범위의 사건 증빙·미달 물량 및 회복일정 확인
원천 최신성 / 확인 필요	기존 원장의 STALE_SOURCE 표시 · 원천 기준일 30일 초과 기준	현재 현황과 관측시점 차이 가능	원천 기준일·공표일·수집일을 분리하여 최신 판본 확인
물량·집계범위 / 확인 필요	연결 원천의 계획 호수 차이	일부 유형·전체 사업 혼합 가능성	포함관계와 채택 사유·변경 판본 대조
추정·선후관계 / 검토	관리 도달량에 추정 또는 후행 도달 근거 포함	원천 사건일·해당 물량의 직접 검증 필요	추정 사유를 유지하고 실제 사건 근거 추가 확인

8. 향후 주요 일정 및 조치 필요사항

□ 예정 일정은 등록된 계획의 정밀도와 범위를 유지합니다. 담당 기관·완료 기한이 지정되지 않은 조치는 제안으로 구분합니다.

시기별 주요 계획

기간	조회 종료일	계획 일정·물량
향후 1개월	2026-11-23	등록 일정 없음
향후 3개월	2027-01-23	등록 일정 없음
향후 6개월	2027-04-23	등록 일정 없음
연말	2026-12-31	등록 일정 없음

조치 관리 제안

조치	확인 대상	담당 / 기한	상태
동일 범위의 사건 증빙·미달 물량 및 회복일정 확인	공급	미지정 / 미확정	보고서 제안 · 공식 배정 아님
원천 기준일·공표일·수집일을 분리하여 최신 판본 확인	원천 최신성	미지정 / 미확정	보고서 제안 · 공식 배정 아님
포함관계와 채택 사유·변경 판본 대조	물량·집계범위	미지정 / 미확정	보고서 제안 · 공식 배정 아님
추정 사유를 유지하고 실제 사건 근거 추가 확인	추정·선후관계	미지정 / 미확정	보고서 제안 · 공식 배정 아님

9. 종합평가 및 정책관리 의견

□ 관리 확인 4건. 계획대로 진행 중인지 확정하려면 원천 사건과 비교 기준의 보완이 필요합니다.

○ 가장 최근 등록 변경: 2026-10-22 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정.

○ 우선 확인사항: 공급, 원천 최신성, 물량·집계범위, 추정·선후관계. 원인·회복일정·실제 기관 승인 여부는 근거 확인 후 판단합니다.

HOME_PROJECT_BRIEF_V1_20261023 · SAMPLE-partial-scope · 입력 SHA-256
4dc20533249a032f39cfec311289004346dc2b6fa3c3ae335dc2318638398e3d
공식 기관 승인보고서가 아닌 저장 원장 기반 분석입니다.
