HANDOVER / FIELD GUIDE

업무 인수인계 상세 실무보고서

처음 업무를 맡는 담당자가 사업의 맥락·추진 과정·현안·다음 행동을 연결하여 파악하도록 재구성한 업무별 실무 인계서

기준일	표시 업무	원천 문서	고유 관리번호
2026. 11. 09	5 건	11 건	4 개

보고서 활용 목적

무엇을 하는 업무인가	업무 개요·목적·범위·주요 산출물과 역할을 업무별로 설명
어디까지 왔는가	계획부터 최신 보고까지 완료 사항과 남은 일을 시간 순서로 비교
이제 무엇을 할 것인가	현안별 조치 순서·기한·확인자료·종결 판단 기준을 명시
무엇이 불확실한가	원문에 없는 결재권한·자료 경로·내부절차·업무 간 관계는 확인 필요로 별도 식별

작성 기준

① ZIP 의 원문 11 건과 업무현황 이미지 1 건을 기준으로 작성 ② 원문 확인 사실과 실무상 권고 분리 ③ 미확인 사항은 단정하지 않음

자료 성격 모든 기관명·업무·실적은 사용자가 제공한 가상 한빛시 합성자료입니다. 실제 행정업무에 즉시 적용할 때에는 최신 업무기록·내부 지침·결재체계·공식 연락처의 추가 확인이 필요합니다.


2026 년 11 월 9 일 | 인수인계 교육·보고용 샘플

01 핵심 요약 및 진행 현황

기준일 2026.11.09 / 5 개 표시 업무. 동일 관리번호가 사용된 2 개 행은 별개 사업으로 확정하지 않았습니다.

지연 / 우선처리	3 일 내 마감	완료 보고	관리 체계 확인
1 건 · HB-002	1 건 · HB-001	1 건 · HB-003	HB-004 중복

업무 진행률 및 일정 구조

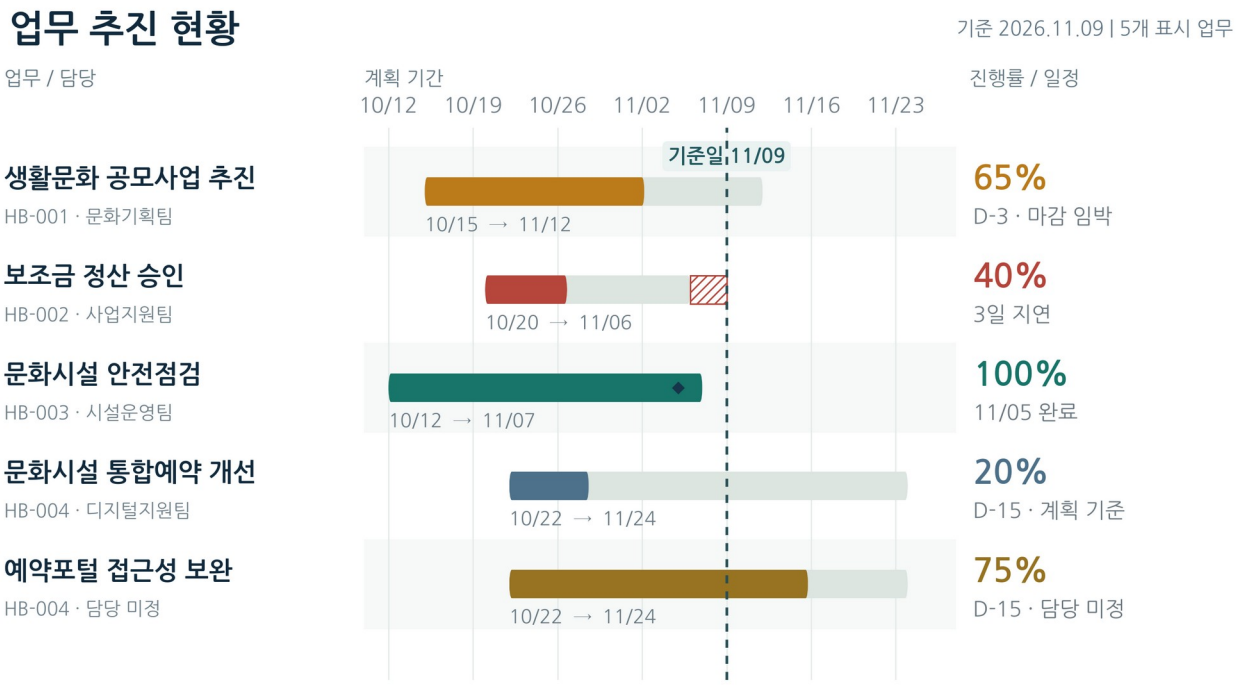

색상 구간은 보고 진행률을 계획 기간에 비례 투영한 시각화입니다. 실제 작업일자·일정 달성률을 의미하지 않습니다.

진행률은 각 보고서 작성 시점의 수치입니다. 특히 HB-004 의 20%는 10/22 계획보고, 75%는 11/08 별도 명칭 중간보고로 동일 기준의 수치라고 단정할 수 없습니다.

가장 먼저 확인할 세 가지 ① 정산 승인 지연 사유와 새 승인 일정 ② 11/12 공모 심사자료 2 건 보완 여부 ③ HB-004 업무 동일성·담당자·완료 기준

02 인수자가 먼저 읽을 운영 가이드

원문과 실제 업무환경의 공백을 먼저 드러내야 인수 후 담당 업무를 독립적으로 수행할 수 있습니다.

인계일 당일 확인 순서

순서	확인 대상	판단과 후속조치
① 지연	HB-002 / 11.06 기한 경과	누락 영수증 2 개 단체 상태, 승인 재일정 및 결재권자 확인
② 임박	HB-001 / 11.12 심사	11.10 보완자료 2 건 요청 이행 및 심사위원 확정·자료 배포 여부 확인
③ 모호성	HB-004 / 동일 관리번호	통합예약 개선과 접근성 보완 관계 및 담당·검수 책임 확정
④ 완료 보관	HB-003 / 11.05 완료	완료보고 외 최종 점검표·교체 증빙·원본 결재 위치 확인

이 문서의 표시 체계

원문 확인	원문 파일에 명시된 실행 결과·수치·보고일·기한·담당만 기재
권고 실행	후임자의 운영을 돕기 위한 절차·검증 포인트·권고 관리 시점
확인 필요	증빙 미첨부, 연락처 미유효, 결재권한·업무 관계가 아직 확정되지 않은 부분

실무 수행 전 공통으로 받아야 할 자료

구분	확보·확인할 정보
관리정보	공식 업무대장, 업무별 고유번호, 현재 담당·대체 담당, 보고 및 결재권자
공식 원본	원문 파일과 첨부 증빙, 공식 전자문서 결재 상태, 저장 경로·열람 권한
진행 관리	실제 최종 실행일, 다음 마감, 대외 회신 여부, 장애·보완 사항 담당자
소통 채널	실제 협의 부서 및 관계자 연락처: 원문의 example.invalid 주소는 예시 값

원문상 불확실성 HB-004 동일 관리번호는 하나의 사업에 대한 경과 기록일 수도, 하위과제 기록일 수도 있습니다. 양자의 진행률을 더하거나 75%로 일괄 갱신해서는 안 됩니다.

03-01 생활문화 공모사업 추진 | 업무 이해

표시 관리번호 HB-001 · 인계 담당 문화기획팀 · 마감 임박 (11.12, D-3)

계획 시작	원문 기한	최근 보고 기준
2026.10.15	2026.11.12	65% / 11.08 중간보고

1. 업무 개요와 목적

생활문화 공모의 사업 범위·심사 기준을 정리한 뒤 공고·접수·자격 검토·심사 및 선정 결과 결재로 이어지는 업무입니다. 원문상 최종 단계는 11 월 12 일 심사 개최와 선정 결과 결재입니다.

업무 범위	공고·설명회, 신청 접수·자격 검토, 심사위원 확보, 심사자료 확정·배포, 심사와 선정 결과 결재
담당 / 협의	문화기획팀 / 행정지원팀 (원문 기재)
확인되지 않은 정보	지원 자격 세부 기준, 심사표·배점, 심사위원 구성·확정 여부, 공모 예산 및 선정 규모, 결재선은 원문에 없음

2. 당초 추진계획부터 최근 보고까지

구간·단계	계획·추진 사항	보고상 처리 상태
10.15 / 계획	사업 범위와 심사 기준 초안 작성	완료로 보고(S01)
10.26 / 착수	공고 게시·설명회 개최	완료로 보고(S02)
11.08 / 중간	신청 20 건 접수 및 자격 검토	완료로 보고(S03)
11.12 / 예정	심사 개최·선정 결과 결재	미완료·예정(S03)

3. 현재 추진현황 — 업무 결과를 분리하여 파악

신청·검토	20 건 접수 / 자격 검토 완료
남은 관문	11.12 심사 및 선정 결재
실제 제약	심사자료 2 건 보완 미접수

주의: 진행률은 각 문서의 전체 업무 기준 보고치로, 세부 검토 건수나 일정 경과율을 단순 환산한 수치가 아닙니다.

근거: S01 10.15 계획 / S02 10.26 착수 / S03 11.08 중간

04-01 생활문화 공모사업 추진 | 후속 실행

최근 이슈 · 향후계획 · 후임자 처리 절차 · 종료 판단 · 필요 증빙

4. 최근 이슈 및 업무 위험

보고 시점	확인된 이슈	현황 해석 / 후속 확인
10.26 / 과거	심사위원 1 명 섭외 대기	11.08 자료에서 해결 여부 미확인. 명단·수락 증빙 확인 필요
11.08 / 최신	심사자료 2 건 보완 미접수	심사 전 자료 완결성에 영향을 줄 수 있으므로 11.10 보완 요청 및 수령 확인

5. 향후 추진계획 및 일정

시점·성격	후임자가 해야 할 일	확보할 결과물
11.09 / 권고	신청 20 건·자격 검토 완료 내역, 미비자료 2 건의 대상 및 요청 이력 점검	접수·검토대장, 보완 대상 명세
11.10 / 원문	보완자료 요청 후 접수 여부 확인, 심사자료 배포	보완요청·수령 기록, 심사 배포본
11.12 / 원문	심사위원 참석 확정 상태 확인, 심사 개최 및 선정 결과 결재	심사 개최 기록, 결과·결재문서
심사 후 / 권고	선정 결과 후속 공지·민원 대응 책임/절차 및 기록 보관 확인	확정 공지 원본·보관 위치(존재 여부 확인)

6. 후임자 실무 처리 순서 (권고 절차)

01 계획보고의 사업 범위·심사 기준 초안과 실제 공고문 최종본의 차이를 확인한다.

02 착수·중간보고의 접수 20 건과 심사 대상 명단을 접수대장으로 대조한다.

03 보완자료 2 건의 요청·수령 상태를 분리 표시하고, 미수령이면 심사자료 배포 전에 담당자에게 보고한다.

04 심사위원의 참여 확정 및 이해관계 확인 절차가 내부 규정에 있는지 확인한다.

05 심사 결과 결재가 완료되어야 완료로 전환하고 최종본과 결재번호를 인수인계 대장에 기록한다.

7. 완료 판단 및 증빙 인수

종결 판단 심사 개최와 선정 결과 결재의 완료 증빙을 확인했을 때 종료 여부 판단. 다른 후속 집행·공고 의무는 내부 규정 확인 필요.

필요 증빙 / 확인할 산출물: 계획보고(S01)·착수보고(S02)·중간보고(S03), 실제 공고문, 접수·검토대장(20 건), 심사위원 확정 자료, 보완자료(2 건), 심사결과 결재 문서

근거: S01 10.15 계획 / S02 10.26 착수 / S03 11.08 중간

03-02 보조금 정산 승인 | 업무 이해

표시 관리번호 HB-002 · 인계 담당 사업지원팀 · 기한 3 일 경과 (11.06)

계획 시작	원문 기한	최근 보고 기준
2026.10.20	2026.11.06	40% / 11.08 중간보고

1. 업무 개요와 목적

보조사업 관련 단체들이 제출하는 정산서를 접수하고 증빙을 대조·검토하여 최종 승인하는 업무입니다. 원문상 정산 대상은 10 개 단체이며, 제출서류 확보와 적정성 검토를 구분하여 관리해야 합니다.

업무 범위	정산자료 제출 안내·접수, 영수증 등 증빙 완비 확인, 단체별 적정성 검토, 승인 일정 협의 및 승인 기록
담당 / 협의	사업지원팀 / 행정지원팀 (원문 기재)
확인되지 않은 정보	보조사업 범위·금액, 정산 세부 기준·교부조건, 승인권자, 실제 심사·회계 시스템, 기한 연장 승인 절차는 원문에 없음

2. 당초 추진계획부터 최근 보고까지

구간·단계	계획·추진 사항	보고상 처리 상태
10.20 / 계획	제출 목록·검토 기준 작성	완료로 보고(S04)
10.28 / 착수	10 개 단체 중 6 개 단체 정산서 접수	6 건 접수 / 4 건 미제출(S05)
11.06 / 기한	최종 정산 승인 예정 기한	기한 경과·미완료(S06)
11.08 / 중간	10 개 단체 정산서 접수·4 개 단체 검토 완료	접수 10/10, 검토 4/10(S06)

3. 현재 추진현황 — 업무 결과를 분리하여 파악

정산서 접수	10 / 10 개 단체
실질 검토	4 / 10 개 단체 완료
병목	2 개 단체 영수증 누락

주의: 진행률은 각 문서의 전체 업무 기준 보고치로, 세부 검토 건수나 일정 경과율을 단순 환산한 수치가 아닙니다.

근거: S04 10.20 계획 / S05 10.28 착수 / S06 11.08 중간

04-02 보조금 정산 승인 | 후속 실행

최근 이슈 · 향후계획 · 후임자 처리 절차 · 종료 판단 · 필요 증빙

4. 최근 이슈 및 업무 위험

보고 시점	확인된 이슈	현황 해석 / 후속 확인
10.28 / 과거	4 개 단체 정산자료 미접수	11.08 에는 10 개 단체 정산서 접수로 해소된 것으로 확인
11.08 / 최신	2 개 단체 영수증 누락 및 기한 경과	기한 11.06 을 지났으며 승인 일정 재협의가 필요

5. 향후 추진계획 및 일정

시점·성격	후임자가 해야 할 일	확보할 결과물
즉시 / 원문	누락 영수증 2 개 단체에 보완 요청, 회신·제출 시한 명확화	요청 문서 및 회신·증빙 접수 기록
즉시 / 원문	승인 지연 경위와 새 승인 일정 관계 부서 협의	지연 사유·변경 일정 합의 기록
순차 / 원문	4 개 검토 완료 단체의 근거 확인 후 나머지 6 개 단체 증빙 대조·검토	단체별 검토표와 지적·보완 결과
완료 시 / 권고	최종 승인 여부 및 결재 문서 확인, 정산자료 보관	승인 원문과 단체별 최종 기록

6. 후임자 실무 처리 순서 (권고 절차)

01 단체별 관리표를 10 행으로 만들고 접수 여부·영수증 완비·검토·승인 항목을 구분한다.

02 11.08 기준 검토 완료 4 건의 검토표와 미완료 6 건의 분류·보완상태를 확인한다.

03 영수증 누락 2 개 단체의 구체 항목·금액·보완요청 이력을 찾는다(자료 미제공 시 전임자 확인).

04 기한 경과 사유 및 재일정을 관련 책임자에게 보고하며 실제 권한·절차는 내부 규정에 따른다.

05 증빙 완비 및 검토 적정성 판단 뒤 결재를 거쳐 승인 상태를 갱신한다.

7. 완료 판단 및 증빙 인수

종결 판단 누락 증빙 확보, 10 개 단체 정산 적정성 검토, 최종 승인 결재가 모두 확인되어야 완료 판단.

필요 증빙 / 확인할 산출물: 계획보고(S04)·착수보고(S05)·중간보고(S06), 10 개 단체별 정산서, 검토표(완료 4 건·잔여 6 건), 영수증 보완 2 건, 승인 결재 및 일정 재협의 기록

근거: S04 10.20 계획 / S05 10.28 착수 / S06 11.08 중간

03-03 문화시설 안전점검 | 업무 이해

표시 관리번호 HB-003 · 인계 담당 시설운영팀 · 11.05 완료 보고

계획 시작	원문 기한	최근 보고 기준
2026.10.12	2026.11.07	100% / 11.05 완료보고

1. 업무 개요와 목적

문화시설의 점검 대상과 점검표를 확정하고 현장 점검에서 발견된 보수사항을 처리한 뒤 재점검 및 최종 결재로 종료한 업무입니다. 현 시점의 인계 핵심은 미결 처리보다 완료 증빙 보관과 차기 점검 연계입니다.

업무 범위	대상 시설·점검표 확정, 시설 5 곳 현장 점검, 보수 총 8 건 처리, 지하 비상구 유도등 2 개 교체·재점검, 결과 결재
담당 / 협의	시설운영팀 / 행정지원팀 (원문 기재)
확인되지 않은 정보	시설별 위치와 고유 식별, 실제 안전점검표·사진, 보수업체·보수비용, 차기 정기점검 주기와 법적 의무는 원문에 없음

2. 당초 추진계획부터 최근 보고까지

구간·단계	계획·추진 사항	보고상 처리 상태
10.12 / 계획	대상 시설과 점검표 확정	완료로 보고(S07)
10.25 / 착수	시설 5 곳 점검, 보수 8 건 중 6 건 완료	보수 2 건 남음(S08)
10.25 / 이슈	지하 비상구 유도등 2 개 고장	교체 일정 확인 필요(S08)
11.05 / 완료	유도등 2 개 교체·재점검 및 최종 결과 결재	100% 완료로 보고(S09)

3. 현재 추진현황 — 업무 결과를 분리하여 파악

점검 대상	시설 5 곳
보수 조치	완료보고상 잔여 현안 해소
종결 현황	11.05 완료보고

주의: 진행률은 각 문서의 전체 업무 기준 보고치로, 세부 검토 건수나 일정 경과율을 단순 환산한 수치가 아닙니다.

근거: S07 10.12 계획 / S08 10.25 착수 / S09 11.05 완료

04-03 문화시설 안전점검 | 후속 실행

최근 이슈 · 향후계획 · 후임자 처리 절차 · 종료 판단 · 필요 증빙

4. 최근 이슈 및 업무 위험

보고 시점	확인된 이슈	현황 해석 / 후속 확인
10.25 / 과거	지하 비상구 유도등 2 개 고장	11.05 완료보고상 교체 및 재점검 완료
11.05 / 최신	잔여 업무 없음·현안 해소	실물 점검표·결재 원본의 보관 위치는 보고서만으로 확인 불가

5. 향후 추진계획 및 일정

시점·성격	후임자가 해야 할 일	확보할 결과물
인계 시 / 원문	점검 결과서를 보관하고 차기 정기점검에서 참고	최종 결과서·보관 경로
인계 시 / 권고	시설 5 곳 점검표·보수 8 건 내역·교체 전후 증빙 확인	점검표·보수내역·사진 등 실제 존재 자료
차기 점검 전 / 권고	직전 점검의 이상 이력과 차기 계획·담당자를 연결	점검 일정·관리대장

6. 후임자 실무 처리 순서 (권고 절차)

01 11.05 완료보고의 결재 완료 기재를 실제 원본 결재번호와 대조한다.

02 시설 5 곳의 대상 목록, 8 건 보수사항, 유도등 2 개 교체 기록이 서로 일치하는지 점검한다.

03 재점검 기록 및 최종 결과서 보관 경로·접근권한을 확보한다.

04 차기 정기점검 일정과 소관자를 확인하되, 원문에 없는 주기·법령을 임의로 기입하지 않는다.

7. 완료 판단 및 증빙 인수

종결 판단 11.05 완료보고로 완료 상태가 확인됩니다. 후임자는 행정적 완료를 재판정하기보다 실제 완료 증빙의 위치·열람 가능 여부를 확인하면 됩니다.

필요 증빙 / 확인할 산출물: 계획보고(S07)·착수보고(S08)·완료보고(S09), 시설별 점검표(5 곳), 보수 내역(8 건), 유도등 교체·재점검 증빙, 최종 결재 원본

근거: S07 10.12 계획 / S08 10.25 착수 / S09 11.05 완료

03-04 문화시설 통합예약 개선 | 업무 이해

표시 관리번호 HB-004 · 인계 담당 디지털지원팀 · 계획 이후 후속 확인 필요

계획 시작	원문 기한	최근 보고 기준
2026.10.22	2026.11.24	20% / 10.22 계획보고

1. 업무 개요와 목적

문화시설 통합예약 서비스의 요구사항을 정리하고 화면 초안을 만든 뒤 개발·접근성 점검·운영 반영으로 이어지는 개선 업무입니다. 다만 이 명칭의 최신 근거는 10 월 22 일 계획보고 1 건뿐입니다.

업무 범위	요구사항 12 건 정리, 화면 초안 작성, 개발사 구현 범위 확정, 개발·접근성 검토 및 운영 반영
담당 / 협의	디지털지원팀 / 행정지원팀 (원문 기재)
확인되지 않은 정보	요구사항 12 건의 상세 내용, 계약·예산·개발 일정, 기능별 완료 기준, 시스템 운영 주체, S11 과 동일 과제 여부는 원문에 없음

2. 당초 추진계획부터 최근 보고까지

구간·단계	계획·추진 사항	보고상 처리 상태
10.22 / 계획	요구사항 12 건 정리·화면 초안 작성	진행률 20% 기재(S10)
이후 / 원문 예정	개발사와 구현 범위 확정	결과·일자 자료 없음
11.24 / 원문 기한	개발·접근성 점검 후 운영 반영	완료 여부 자료 없음

3. 현재 추진현황 — 업무 결과를 분리하여 파악

확인된 요구	12 건 정리
최신 명칭별 보고	10.22 계획보고
계획 기한	11.24

주의: 진행률은 각 문서의 전체 업무 기준 보고치로, 세부 검토 건수나 일정 경과율을 단순 환산한 수치가 아닙니다.

근거: S10 10.22 계획 / 연계 확인문서 S11 11.08 중간

04-04 문화시설 통합예약 개선 | 후속 실행

최근 이슈 · 향후계획 · 후임자 처리 절차 · 종료 판단 · 필요 증빙

4. 최근 이슈 및 업무 위험

보고 시점	확인된 이슈	현황 해석 / 후속 확인
10.22 / 보고	계획 당시 현안 없음	후속 실행·검수 현황은 원문에 없음
11.08 / 식별	접근성 보완 중간보고(S11)와 HB-004 중복	동일 사업/하위과제/별도 사업 관계 확인 전 상태·진행률 변경 금지

5. 향후 추진계획 및 일정

시점·성격	후임자가 해야 할 일	확보할 결과물
즉시 / 권고	요구사항 12 건 목록·화면 초안과 개발 범위 합의 문서 확보	요구사항 목록, 개발 범위·담당 확인
즉시 / 권고	S11 과의 관계를 실제 사업관리대장·전임자에게 확인	단일/상하위/별도 과제 판단 근거
11.24 전 / 원문	개발 결과·접근성 점검 결과 확인 후 운영 반영 여부 결정	기능시험·접근성 점검·운영 반영 자료
운영 반영 뒤 / 권고	검수·승인 상태 기록 및 운영 유지관리 담당 확인	검수·승인 이력, 인수·운영담당 기록

6. 후임자 실무 처리 순서 (권고 절차)

01 요구사항 12 건의 일련번호별 구현 여부를 확인할 기준표를 확보한다.

02 실제 화면 초안·변경 이력을 확인하고 구현 범위를 개발사와 서면 대조한다.

03 S11 에 이미 완료됐다고 적힌 예약 화면 개발이 이 업무의 일부인지부터 판정한다.

04 기능시험·접근성 점검 및 운영 반영 승인 절차를 내부 운영 규정과 대조한다.

05 검수 근거와 운영 반영 일자를 확인하기 전에는 계획보고의 20%를 현재 실적으로 표시하지 않는다.

7. 완료 판단 및 증빙 인수

종결 판단 11.24 기한 내 개발·접근성 검수·운영 반영 여부를 공식 증빙으로 확인한 후 완료 판단. S11 과의 과제 관계가 먼저 정리되어야 합니다.

필요 증빙 / 확인할 산출물: 통합예약 개선 계획보고(S10), 요구사항 12 건 명세, 화면 초안, 개발 범위 협의 기록, 개발·검수 산출물, S11 업무 관계 확인 기록

근거: S10 10.22 계획 / 연계 확인문서 S11 11.08 중간

03-05 예약포털 접근성 보완 | 업무 이해

표시 관리번호 HB-004 · 인계 담당 담당 미정 · 책임자·과제 관계 미확정

계획 시작	원문 기한	최근 보고 기준
2026.10.22	2026.11.24	75% / 11.08 중간보고

1. 업무 개요와 목적

예약포털의 예약 화면 개발과 기능시험을 마친 뒤 키보드 탐색 관련 접근성 오류를 수정·재시험하여 운영에 반영하는 업무로 보고되어 있습니다. 그러나 담당 부서는 원문에 '미정'으로 되어 있습니다.

업무 범위	예약 화면 개발·기능시험, 키보드 탐색 오류 2 건 수정, 재시험, 운영 반영 및 담당·과제 관계 확정
담당 / 협의	담당 미정 / 행정지원팀 (원문 기재)
확인되지 않은 정보	오류 2 건의 발생 화면·재현 경로, 접근성 평가 근거·도구, 재시험 합격 기준, 개발사 담당 및 운영 승인권자, 통합예약 과제 관계는 원문에 없음

2. 당초 추진계획부터 최근 보고까지

구간·단계	계획·추진 사항	보고상 처리 상태
10.22 / 시작 기준	기재된 계획 시작일(별도 계획보고는 없음)	원문(S11)
11.08 / 중간	예약 화면 개발 및 기능 시험 완료	진행률 75%(S11)
11.08 / 이슈	키보드 탐색 오류 2 건 미해결	개발사 재현 절차 전달 필요
11.24 / 원문 기한	접근성 오류 수정 후 운영 반영	예정·미완료

3. 현재 추진현황 — 업무 결과를 분리하여 파악

예약 화면	개발·기능시험 완료
접근성 결함	키보드 탐색 2 건
담당자	미정 · 전임자 확인

주의: 진행률은 각 문서의 전체 업무 기준 보고치로, 세부 검토 건수나 일정 경과율을 단순 환산한 수치가 아닙니다.

근거: S11 11.08 중간 / 동일 관리번호의 계획보고 S10 10.22 (관계 미확정)

04-05 예약포털 접근성 보완 | 후속 실행

최근 이슈 · 향후계획 · 후임자 처리 절차 · 종료 판단 · 필요 증빙

4. 최근 이슈 및 업무 위험

보고 시점	확인된 이슈	현황 해석 / 후속 확인
11.08 / 최신	키보드 탐색 오류 2 건 미해결	재현 절차를 개발사에 전달하고 수정 후 재시험해야 함
11.08 / 관리	담당 미정·HB-004 중복	업무 관계와 실질 책임자 확정 전에는 검수·운영 반영 책임 공백

5. 향후 추진계획 및 일정

시점·성격	후임자가 해야 할 일	확보할 결과물
즉시 / 원문	개발사에 오류 2 건의 재현 절차 전달	각 오류의 재현 절차·접수 회신
즉시 / 권고	전임자에게 실제 담당 부서·검수 책임자와 S10 관계 확인	담당자 및 관리번호 확정 기록
11.24 전 / 원문	오류 수정본을 키보드 방식으로 재시험하고 결과 기록	수정 내역, 오류별 재시험 결과
운영 반영 시 / 원문	접근성 결함 조치 확인 후 운영 반영	운영 반영 승인·배포 내역(확인 필요)

6. 후임자 실무 처리 순서 (권고 절차)

01 오류 2 건을 별개로 분리해 화면·동작·기대 결과·실제 결과를 정리한 재현 문서를 확보한다.

02 개발사에 접수 후 수정 버전·수정 담당·배포 예정일을 확인한다(담당자 실명은 원문 없음).

03 키보드만으로 동일 절차를 다시 실행해 오류별 해결 여부를 기록한다.

04 원문의 '기능 시험 완료'와 '접근성 검증 완료'를 혼동하지 않는다.

05 운영 반영 이전에 S10 업무와의 관계 및 승인 권한을 확정한다.

7. 완료 판단 및 증빙 인수

종결 판단 오류 2 건의 수정·재시험 확인, 운영 반영 기록, 책임자 확정이 모두 확인되어야 최종 완료 여부를 판단할 수 있습니다.

필요 증빙 / 확인할 산출물: 접근성 보완 중간보고(S11), 재현 절차·오류 2 건 목록, 개발사 수정·회신 기록, 키보드 탐색 재시험 결과, 운영 반영 내역, 담당자 지정 기록

근거: S11 11.08 중간 / 동일 관리번호의 계획보고 S10 10.22 (관계 미확정)

05 최우선 의사결정 및 30 일 운영계획

원문 기한은 사실이며, 인수자 편의를 위해 제시한 관리시점은 별도로 “권고” 표시했습니다.

인계 직후 보고·결재가 필요한 현안

안건	확정해야 할 내용	확인할 자료
D1 / 지연 정상화	HB-002: 누락 영수증 2 건, 6 개 단체 잔여 검토, 새 승인일 및 지연 사유	정산대장·보완 요청 이력·재협의 기록
D2 / 심사 준비	HB-001: 심사자료 보완 2 건, 심사위원 섭외 최종 상태, 11.12 심사·결재 준비	자료 배포본·심사위원 확정·결재 경로
D3 / 중복 식별	HB-004: S10 과 S11 이 동일/하위/별도 업무인지, 실제 책임 부서와 검수권자	업무대장·개발 범위·전임자 확인·공식 결정
D4 / 접근성 검수	예약포털: 키보드 탐색 2 건 수정·재시험과 운영 반영 요건	오류 재현·수정 이력·재시험 기록

D0~D+30 권고 운영 루틴

시점	점검·실행 항목	보고·판정 방식
인계 당일	D1~D3 결정안건과 담당 지정, 자료 접근권한 확인	미확정 항목별 확인 요청자·회신 예정일 기록
11.10	공모자료 보완 2 건 요청·확인, HB-004 관계 확인	접수 증빙과 관리체계 결정자료 확보
11.12	공모 심사·선정 결과 결재 진행 여부 확인	실제 개최/결재 여부로만 상태 갱신
11.24 전	예약/접근성 보완 테스트·수정·운영반영 요건 점검	검수 근거·승인 기록과 남은 오류 관리
인계 후 30 일	완료 증빙·업무별 관리대장·차기 일정을 재정리	원문 근거, 담당, 차기조치, 증빙 링크를 관리

보고 체계 제안 실무 상태를 “예정 / 진행 / 보완 요청 / 지연 / 검수 대기 / 결재 완료” 등으로 구분해 기록하고, 위험 발생 시 보고권자·협의 경로를 실제 기관 규정으로 확정합니다.

06 원문 색인과 실제 인계자료 확보표

ZIP 속 11 건은 보고 문서이며, 상세 원본·증빙·결재 확인에는 추가 확보가 필요할 수 있습니다.

원문별 보고 이력

문서 ID	업무관리	보고일 / 단계	원문 파일 및 주요 정보
S01	HB-001	10.15 / 계획	생활문화 공모사업 추진 계획보고 · 기준 초안, 10%
S02	HB-001	10.26 / 착수	생활문화 공모사업 추진 착수보고 · 공고·설명회, 35%
S03	HB-001	11.08 / 중간	생활문화 공모사업 추진 중간보고 · 접수 20 건, 65%
S04	HB-002	10.20 / 계획	보조금 정산 승인 계획보고 · 검토 기준, 0%
S05	HB-002	10.28 / 착수	보조금 정산 승인 착수보고 · 6 개 단체 접수, 20%
S06	HB-002	11.08 / 중간	보조금 정산 승인 중간보고 · 4 개 검토, 40%
S07	HB-003	10.12 / 계획	문화시설 안전점검 계획보고 · 대상·점검표 확정, 10%
S08	HB-003	10.25 / 착수	문화시설 안전점검 착수보고 · 5 곳·8 건 중 6 건, 70%
S09	HB-003	11.05 / 완료	문화시설 안전점검 완료보고 · 최종 결재, 100%
S10	HB-004	10.22 / 계획	문화시설 통합예약 개선 계획보고 · 요구사항 12 건, 20%
S11	HB-004	11.08 / 중간	예약포털 접근성 보완 중간보고 · 키보드 결함 2 건, 75%

06B 인계자료 보완 및 접근 정보

원문 보고서에 기록되지 않은 원본 저장 위치·전자문서·처리 화면은 후임자가 실제 열람하도록 인계해야 합니다.

반드시 실물 확인이 필요한 보충자료

업무	원문 외 확보가 필요한 문서 / 정보
HB-001	실제 공고문·접수대장·보완자료 2 건·심사위원 확정·심사 및 선정 결과 결재
HB-002	10 개 단체별 정산서 및 검토표·누락 영수증·승인 재일정·최종 승인 결재
HB-003	시설 5 곳 점검표·보수 8 건 증빙·유도등 교체·재점검·최종 결재 원본
HB-004	요구사항 12 건·범위 합의·접근성 결함 2 건·시험 결과·업무 관계와 담당 확정

추가로 작성할 시스템·문서 접근 정보

저장 위치 / 보관 기준	[확인 필요] 공식 문서함·공유 저장소·첨부 증빙 보관 경로, 보존·접근 권한
전자결재 경로	[확인 필요] 사업별 결재 문서 식별번호·진행 상태·결재권자
담당자 연락처	[확인 필요] 각 업무 실제 담당자·협의자·개발사 연락처 및 대체 담당

원문의 work1~4@example.invalid 는 예시 주소로 실제 연락처가 아니며, 저장소 경로·접근권한도 제공되지 않았습니다.

07 인계완료 검증 및 확인 서명

“자료가 존재한다”와 “인수자가 자료를 열람하고 실제 처리 가능하다”는 다른 상태입니다.

완전한 인계를 위한 점검표

☐ **업무 맥락** 5 개 표시 업무의 목적·범위·단계·성과·잔여사항을 후임자가 설명할 수 있음

☐ **처리권한** 실제 담당·결재권자·협의부서·대체 담당·연락처 확인

☐ **지연 정상화** HB-002 기한 경과 대응과 재승인 일정·미결 사항의 책임자 지정

☐ **심사 실행** HB-001 심사자료 2 건·심사위원 상태·심사 당일 결재 경로 인계

☐ **결함 관리** HB-004 오류 2 건 재현·수정·재시험 및 운영 반영 기준 확인

☐ **중복 식별** HB-004 문서 두 건의 동일/상하위/별도 관계 확정

☐ **완료 증빙** HB-003 최종 점검·교체·결재 증빙의 보관위치와 접근권한 확인

☐ **보고 관리** 근거 문서·최신 보고일·다음 행동·담당·증빙 경로의 현행 관리대장 생성

인계 협의 및 서명

구분	성명 / 소속	서명 및 확인일
인계자	_____	_____
인수자	_____	_____
검토자	_____	_____

미확정 사항 및 추가자료 제출기한(직접 기재)

_____

_____

_____

인수 판단 현재 ZIP 원문 11 건만으로는 실제 전자문서·세부 업무처리 화면·결재체계 및 핵심 증빙이 제공되지 않아 독립 수행에 필요한 정보가 완전히 확보됐다고 볼 수 없습니다. 이 점검표를 확인하고 자료를 보완한 뒤 정식 인계완료를 판단해야 합니다.
