업무 인수인계 보고서

종합 인수인계 실무 시연 (1)

인계자 직원 2 → 인수자 직원 3
현안 기준일 2026-11-10 · 확정 판본 289caf22

이전 인계 보고서 기반 · 인수인계 이력

1. 직원 1 → 직원 2 ('26.1.10., 인수인계완료)
2. 직원 2 → 직원 3 ('26.11.10., 이번 인계)

기존 업무 현행화 1건 · 이전 내용 유지 1건 · 신규 업무 3건 · 확인 필요 0건


이전 인수 완료 판본을 보존하고 새 자료를 반영했습니다. 기존 내용 유지 항목은 최신 현황을 다시 확인하세요.

한눈에 보는 업무 진행 현황

지금 어디까지 왔고, 다음에 무엇을 해야 하나

현안 판단 기준일 2026-11-10 · 진행률은 각 업무의 최신 보고에 명시된 값입니다. 문서 수·경과 시간으로 계산하지 않습니다.

5	1	1	1
인계 업무	기한 경과 · 이행 확인	7일 이내 처리 기한	전체 업무 완료

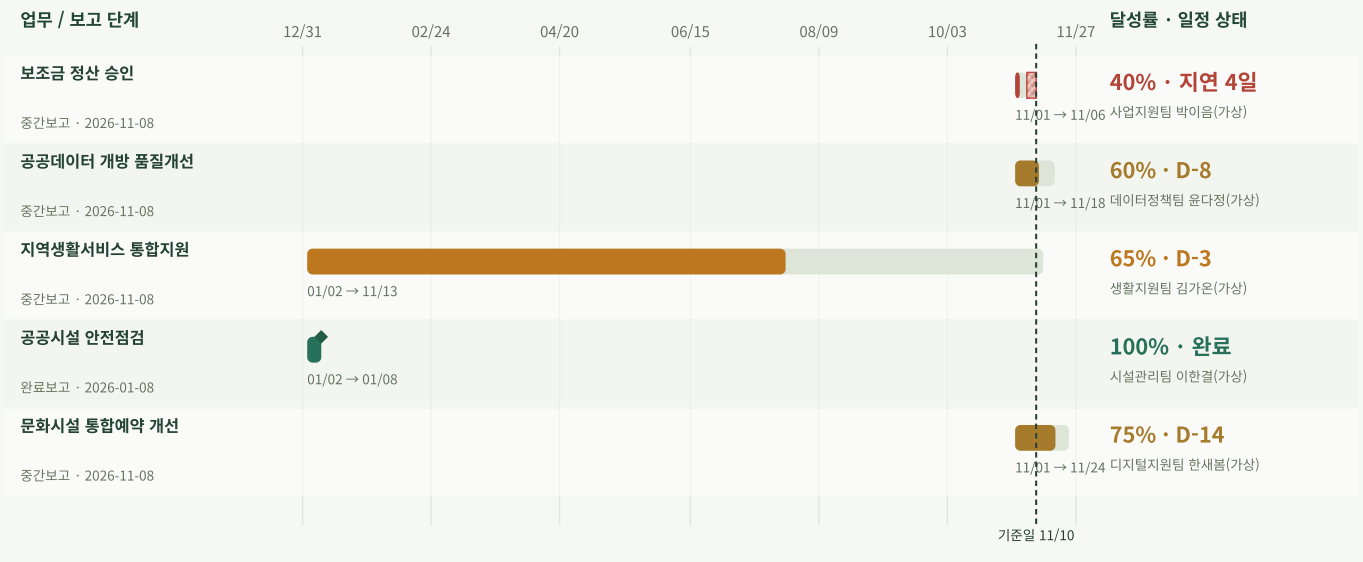

달성률은 기간 경과율이 아닙니다. 지연은 확정 기준일에 기한이 지났고 최신 보고상 미완료인 업무의 경과 일수이며 실제 이행 여부는 담당자가 확인합니다.

업무 / 현재 단계	보고 진행률 / 기한	업무 현안	남은 일 / 바로 할 일
보조금 정산 승인 40% 진행 중 중간 · 3개 보고 연결	40% **기한 4일 경과 · 이행 확인** 기한 2026-11-06 담당 사업지원팀 박이음(가상)	2개 단체 영수증 누락으로 11월 6일 승인 기한 경과	**누락 영수증 수령 후 잔여 6개 단체 검토·승인** 다음: G05·G06 누락 영수증을 즉시 요청하고 승인 지연 경위·재일정을 협의
공공데이터 개방 품질개선 60% 진행 중 중간 · 4개 보고 연결	60% **업무 장애·미결 현안** 기한 2026-11-18 담당 데이터정책팀 윤다정(가상)	Q17·Q18 이용제한 항목의 소관 부서 회신 대기	**잔여 8종 정비, Q17·Q18 이용제한 확인, 20종 공개 전 검증 및 승인** 다음: Q17·Q18 소관 부서에 이용제한 해제 가능 여부를 11월 12일까지 확인 요청

업무 / 현재 단계	보고 진행률 / 기한	업무 현안	남은 일 / 바로 할 일
지역생활서비스 통합지원 65% 진행 중 중간 · 4개 보고 연결	65% 기한 3일 남음 기한 2026-11-13 담당 생활지원팀 김가온(가상)	협약 원본 3건 미접수	**잔여 3개 기관 협약, 담당자 교육 및 결과 보고** 다음: 미접수 3개 기관에 날인 원본 회신을 요청
공공시설 안전점검 사업 완료 완료 · 1개 보고 연결	100% 업무 완료 기한 2026-01-08 담당 시설관리팀 이한결(가상)	없음. 1월 8일 점검·보수 완료; 이후 신규 점검 상황은 별도 확인	**완료 증빙 인수 및 차기 정기점검 일정 확인** 다음: 점검·보수 완료 증빙과 차기 점검 일정 인수 여부를 확인
문화시설 통합예약 개선 75% 진행 중 중간 · 3개 보고 연결	75% 업무 장애·미결 현안 기한 2026-11-24 담당 디지털지원팀 한새봄(가상)	키보드 탐색 오류 D01·D02 미해결	**D01·D02 접근성 오류 보완·재시험 및 운영 반영** 다음: 개발사에 D01·D02 재현 기록을 전달하고 재시험 일정을 협의

인수자의 첫 업무

우선순위와 실행 순서

기한이 지났거나 임박한 업무, 진행을 막는 실제 현안을 먼저 처리합니다. 자료의 불일치는 마지막 참고란에서 확인합니다.

01 보조금 정산 승인

기한 4일 경과 · 이행 확인 · 사업지원팀 박이음(가상) · 2026-11-06

2개 단체 영수증 누락으로 11월 6일 승인 기한 경과

바로 할 일 G05·G06 누락 영수증을 즉시 요청하고 승인 지연 경위·재일정을 협의

원문 기록

03 지역생활서비스 통합지원

기한 3일 남음 · 생활지원팀 김가온(가상) · 2026-11-13

협약 원본 3건 미접수

바로 할 일 미접수 3개 기관에 날인 원본 회신을 요청

원문 기록

02 공공데이터 개방 품질개선

업무 장애·미결 현안 · 데이터정책팀 윤다정(가상) · 2026-11-18

Q17·Q18 이용제한 항목의 소관 부서 회신 대기

바로 할 일 Q17·Q18 소관 부서에 이용제한 해제 가능 여부를 11월 12일까지 확인 요청

원문 기록

05 문화시설 통합예약 개선

업무 장애·미결 현안 · 디지털지원팀 한새봄(가상) · 2026-11-24

키보드 탐색 오류 D01·D02 미해결

바로 할 일 개발사에 D01·D02 재현 기록을 전달하고 재시험 일정을 협의

원문 기록

04 공공시설 안전점검

업무 완료 · 시설관리팀 이한결(가상) · 2026-01-08

없음. 1월 8일 점검·보수 완료; 이후 신규 점검 상황은 별도 확인

바로 할 일 점검·보수 완료 증빙과 차기 점검 일정 인수 여부를 확인

원문 기록

인수 당일 확인 · 시스템 권고

자료 열람 확인 → 기한 경과·임박 업무 담당과 일정 대조 → 필요한 자료 요청 → 인수 확인 기록. 향후 산출물은 이미 존재하는 문서로 처리하지 않습니다.

보조금 정산 승인

사업지원팀 박이음(가상) · 기한 2026-11-06 · 기한 4일 경과 · 이행 확인 · 보고 달성률 40%

현재 기준본: zz99.xlsx · 본문 기준일 2026-11-08 · 2차 · 확정

▶ 최신본 채택·구판 및 초안 제외 근거 (4개 자료)

신규 업무

업무 개요

10개 보조사업자의 집행 증빙을 대조하고 보완·반납 여부를 검토하여 정산 승인하는 업무다.


원문 기록

목표

10개 단체의 적정성 검토·정산 승인과 반납 필요 여부 기록을 모두 마무리한다.

원문 기록

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-11-02 / 계획 / 1차	20%	대상 목록과 추진계획 확정	관계기관 일정 조율 필요
2026-11-08 / 중간 / 1차	35%	대상 목록과 추진계획 확정	관계기관 일정 조율 필요
2026-11-08 / 중간 / 2차	40%	10개 단체 중 4개 단체 검토 완료	2개 단체 영수증 누락으로 11월 6일 승인 기한 경과

현재 진척

40% 진행 중

원문 기록

전체 진행률

4 / 10 단체

개별 실적 ÷ 목표를 표시합니다. 전체 업무 달성률과는 다른 지표입니다.

원문 기록

현안의 발생·해소·잔여 경과

11/06 승인 기한 경과 → 11/08 G05·G06 영수증 보완 대기. 기한 변경 승인은 아직 없다.

원문 기록

업무 01 / B · 실행과 완료 판단

보조금 정산 승인 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

기간	단계 / 할 일	산출물
2026-11-01~11-03	계획·대상 확정	대상 목록
2026-11-04~11-08	현장 이행·증빙 검토	실적 대장
2026-11-10~11-13	보완·관계기관 협의	요청·회신 기록
2026-11-06	결과보고 승인	결재 문서

원문 기록

추후 계획 · 담당·일정·결과물

시점	담당	구체적 조치	남길 결과물	일정의 성격
즉시	사업지원팀 박이음(가상)	누락 영수증 수령 후 잔여 6개 단체 검토·승인	조치 목록	원문 후속조치
2026-11-11	사업지원팀 박이음(가상)	관계부서 진행 상황 재확인	회신 기록	내부 관리 목표·대외 기한 변경 아님

원문 기록

남은 업무

누락 영수증 수령 후 잔여 6개 단체 검토·승인

원문 기록

실무 처리 순서

1. 실적대장에서 대상별 접수 여부 확인
2. 원본 증빙과 수치를 대조하고 누락 건 재요청
3. 담당 검토와 팀장 확인
4. 과장 결재 후 결과 통보
5. 원본·결재 기록·미결 목록을 함께 인계

원문 기록

완료 판단 기준

남은 이행·증빙 대조·담당 검토·결과 결재가 모두 끝나야 완료로 표시한다. 계획이나 사본 접수만으로 완료 처리하지 않는다.

원문 기록

인계 산출물 · 제공 여부

계획·진행 보고, 실적대장, 담당 확인 기록(합성 자료 제공). 향후 생성할 최종 결재문·재시험 결과는 제공된 증빙으로 표시하지 않는다.

원문 기록

보고·결재 체계

실무 담당 → 팀장 검토 → 과장 승인. 기한·예산 변경은 별도 협의·결재가 필요하다.

원문 기록

자료를 찾고 접근하는 방법

합성 공유함 / CP 사업코드 / 계획·실적·결재. 시연 패키지의 q77.xlsx는 증빙대장, memo.pdf는 동일업무 담당 확인 기록이다.

원문 기록

공공데이터 개방 품질개선

데이터정책팀 윤다정(가상) · 기한 2026-11-18 · 업무 장애·미결 현안 · 보고 달성률 60%

현재 기준본: r11.pdf · 본문 기준일 2026-11-08 · 3차 · 확정

▶ 최신본 채택·구판 및 초안 제외 근거 (6개 자료)

신규 업무

업무 개요

공공데이터 20종의 메타데이터·결측값·개방 권한을 정비하고 공개 전 품질 검증을 수행하는 사업이다.


원문 기록

목표

데이터 20종을 동일 품질 기준으로 점검하고 공개 승인과 오류 정정 이력을 남긴다.

원문 기록

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-11-01 / 계획 / 1차	10%	전체 진척 10% 기록; 해당 판의 당시 검토 범위	Q17·Q18 이용제한 항목의 소관 부서 회신 대기
2026-11-06 / 착수 / 2차	30%	전체 진척 30% 기록; 해당 판의 당시 검토 범위	Q17·Q18 이용제한 항목의 소관 부서 회신 대기
2026-11-08 / 중간 / 3차	45%	전체 진척 45% 기록; 해당 판의 당시 검토 범위	Q17·Q18 이용제한 항목의 소관 부서 회신 대기
2026-11-08 / 중간 / 3차	60%	대상 20종 중 메타데이터 정비 12종 완료	Q17·Q18 이용제한 항목의 소관 부서 회신 대기

현재 진척

60% 진행 중

원문 기록

전체 진행률

60 / 100 %

개별 실적 ÷ 목표를 표시합니다. 전체 업무 달성률과는 다른 지표입니다.

원문 기록

현안의 발생·해소·잔여 경과

11/08 오전 잠정 집계를 원자료와 대조한 뒤 같은 날 17:30 3차 정정본으로 확정. 검토중·폐기 판본은 실적으로 쓰지 않는다.

원문 기록

공공데이터 개방 품질개선 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

기간	단계 / 할 일	산출물
2026-11-01	대상 20종 확정	목록표
2026-11-06~11-08	메타데이터 정비·오류 대조	품질점검표
2026-11-12	이용제한 항목 협의	부서 회신
2026-11-18	잔여 검증·공개 승인	결재 기록

원문 기록

추후 계획 · 담당·일정·결과물

추후 계획

2026-11-12 | 데이터정책팀 윤다정(가상) | Q17·Q18 이용제한 회신 확보 | 협의 기록 |
내부 관리 목표
2026-11-18 | 데이터정책팀 윤다정(가상) | 잔여 검증 및 공개 승인 | 품질검증표·결재문 | 계획

원문 기록

남은 업무

잔여 8종 정비, Q17·Q18 이용제한 확인, 20종 공개 전 검증 및 승인

원문 기록

실무 처리 순서

1. 실적대장에서 대상별 접수 여부 확인

원문 기록

완료 판단 기준

남은 이행·증빙 대조·담당 검토·결과 결재가 모두 끝나야 완료로 표시한다. 계획이나 사본 접수만으로 완료 처리하지 않는다.

원문 기록

인계 산출물 · 제공 여부

계획·진행 보고, 실적대장, 담당 확인 기록(합성 자료 제공). 향후 생성할 최종 결재문·재시험 결과는 제공된 증빙으로 표시하지 않는다.

원문 기록

보고·결재 체계

실무 담당 → 팀장 검토 → 과장 승인. 기한·예산 변경은 별도 협의·결재가 필요하다.

원문 기록

자료를 찾고 접근하는 방법

합성 공유함 / CP-005 / 개방 목록·품질점검·승인 기록

원문 기록

지역생활서비스 통합지원

생활지원팀 김가온(가상) · 기한 2026-11-13 · 기한 3일 남음 · 보고 달성률 65%

현재 기준본: 자료/보고서.hwpx · 본문 기준일 2026-11-08 · 3차 · 확정

▶ 최신본 채택·구판 및 초안 제외 근거 (5개 자료)

기존 업무 현행화

업무 개요

8개 시범기관의 신청·협약·서비스 연계 절차를 통일하고 증빙과 교육 결과를 관리하는 업무다.


원문 기록

목표

8개 기관 협약 원본과 교육 이수 결과를 확보하고 운영 결과보고를 승인받는다.

원문 기록

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-01-08 / 계획 / 1차	20%	대상 목록과 추진계획 확정	관계기관 일정 조율 필요
2026-11-01 / 계획 / 1차	20%	대상 목록과 추진계획 확정	관계기관 일정 조율 필요
2026-11-06 / 중간 / 2차	80%	협약 사본 6건 수령, 원본 대조 전 잠정 집계	원본 대조 전 사본 집계이며 확정 실적 아님
2026-11-08 / 중간 / 3차	65%	협약 원본 5건 확인 및 운영 매뉴얼 초안 작성	협약 원본 3건 미접수

현재 진척

65% 진행 중

원문 기록

전체 진행률

5 / 8 기관

개별 실적 ÷ 목표를 표시합니다. 전체 업무 달성률과는 다른 지표입니다.

원문 기록

현안의 발생·해소·잔여 경과

11/06 사본 기준 80% 잠정 보고 → 11/08 원본 대조 후 65%로 정정. 미접수 원본 3건은 계속 미해결.

원문 기록

업무 03 / B · 실행과 완료 판단

지역생활서비스 통합지원 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

기간	단계 / 할 일	산출물
2026-11-01~11-03	계획·대상 확정	대상 목록
2026-11-04~11-08	현장 이행·증빙 검토	실적 대장
2026-11-10~11-13	보완·관계기관 협의	요청·회신 기록
2026-11-13	결과보고 승인	결재 문서

원문 기록

추후 계획 · 담당·일정·결과물

시점	담당	구체적 조치	남길 결과물	일정의 성격
즉시	생활지원팀 김가온(가상)	잔여 3개 기관 협약, 담당자 교육 및 결과보고	조치 목록	원문 후속조치
2026-11-11	생활지원팀 김가온(가상)	관계부서 진행 상황 재확인	회신 기록	내부 관리 목표·대외 기한 변경 아님

원문 기록

남은 업무

잔여 3개 기관 협약, 담당자 교육 및 결과보고

원문 기록

실무 처리 순서

1. 실적대장에서 대상별 접수 여부 확인
2. 원본 증빙과 수치를 대조하고 누락 건 재요청
3. 담당 검토와 팀장 확인
4. 과장 결재 후 결과 통보
5. 원본·결재 기록·미결 목록을 함께 인계

원문 기록

완료 판단 기준

남은 이행·증빙 대조·담당 검토·결과 결재가 모두 끝나야 완료로 표시한다. 계획이나 사본 접수만으로 완료 처리하지 않는다.

원문 기록

인계 산출물 · 제공 여부

계획·진행 보고, 실적대장, 담당 확인 기록(합성 자료 제공). 향후 생성할 최종 결재문·재시험 결과는 제공된 증빙으로 표시하지 않는다.

원문 기록

보고·결재 체계

실무 담당 → 팀장 검토 → 과장 승인. 기한·예산 변경은 별도 협의·결재가 필요하다.

원문 기록

자료를 찾고 접근하는 방법

합성 공유함 / CP 사업코드 / 계획·실적·결재. 시연 패키지의 q77.xlsx는 증빙대장, memo.pdf는 동일업무 담당 확인 기록이다.

원문 기록

공공시설 안전점검

시설관리팀 이한결(가상) · 기한 2026-01-08 · 업무 완료 · 보고 달성률 100%

현재 기준본: b03.hwpx · 본문 기준일 2026-01-08 · 1차 · 확정

▶ 최신본 채택·구판 및 초안 제외 근거 (1개 자료)

이전 보고서 유지 · 이전 기준의 기록입니다. 최신 현황을 재확인하세요.

업무 개요

5개 공공시설 안전점검 및 보수 8건을 완료하고 증빙과 차기 점검 기준을 후임자에게 전달하는 업무다.

원문 기록

목표

5개 시설 점검, 보수 8건 검증, 결과 결재 기록을 보관하고 차기 점검을 준비한다.

원문 기록

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-01-08 / 완료 / 1차	100%	5개 시설 점검 및 보수 8건 조치·결과 결재 완료	없음. 1월 8일 점검·보수 완료; 이후 신규 점검 상황은 별도 확인

현재 진척

사업 완료

원문 기록

전체 진행률

5 / 5 곳

개별 실적 ÷ 목표를 표시합니다. 전체 업무 달성률과는 다른 지표입니다.

원문 기록

현안의 발생·해소·잔여 경과

1월 7일 유도등 2개 교체 → 1월 8일 재점검·결재로 해소. 이후 실적을 추정하지 않는다.

원문 기록

업무 04 / B · 실행과 완료 판단

공공시설 안전점검 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

기간	단계 / 할 일	산출물
2026-01-02	점검계획 확정	대상 목록
2026-01-03~01-07	현장 점검·보수	점검표
2026-01-08	재점검·결과 승인	결재대장

원문 기록

추후 계획 · 담당·일정·결과물

시점	담당	구체적 조치	남길 결과물	일정의 성격
인수 직후	시설관리팀	1월 완료 증빙 대조	인수 확인 기록	완료 사업 유지
차기 점검계획 수립 시	시설관리팀	신규 이상 여부 확인	신규 점검계획	일정 미확정

원문 기록

남은 업무

완료 증빙 인수 및 차기 정기점검 일정 확인

원문 기록

실무 처리 순서

1. 실적대장에서 대상별 접수 여부 확인
2. 원본 증빙과 수치를 대조하고 누락 건 재요청
3. 담당 검토와 팀장 확인
4. 과장 결재 후 결과 통보
5. 원본·결재 기록·미결 목록을 함께 인계

원문 기록

완료 판단 기준

남은 이행·증빙 대조·담당 검토·결과 결재가 모두 끝나야 완료로 표시한다. 계획이나 사본 접수만으로 완료 처리하지 않는다.

원문 기록

인계 산출물 · 제공 여부

시설별 점검 5건·보수 8건·1월 8일 결과 승인 기록(합성 대장). 실제 현장 사진은 제공하지 않는다.

원문 기록

보고·결재 체계

실무 담당 → 팀장 검토 → 과장 승인. 기한·예산 변경은 별도 협의·결재가 필요하다.

원문 기록

자료를 찾고 접근하는 방법

합성 공유함 / CP 사업코드 / 계획·실적·결재. 시연 패키지의 q77.xlsx는 증빙대장, memo.pdf는 동일업무 담당 확인 기록이다.

원문 기록

문화시설 통합예약 개선

디지털지원팀 한새봄(가상) · 기한 2026-11-24 · 업무 장애·미결 현안 · 보고 달성률 75%

현재 기준본: scan_003.pdf · 본문 기준일 2026-11-08 · 3차 · 확정

▶ 최신본 채택·구판 및 초안 제외 근거 (3개 자료)

신규 업무

업무 개요

12개 요구사항의 예약 기능 개선과 접근성 검수, 운영 반영을 하나의 범위로 관리한다. 세 별칭 보고는 모두 같은 사업 전체 범위다.


원문 기록

목표

요구사항 12건 구현, 접근성 오류 2건 해소·재시험, 운영 반영 승인을 완료한다.

원문 기록

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-11-03 / 계획 / 1차	20%	대상 목록과 추진계획 확정	관계기관 일정 조율 필요
2026-11-06 / 착수 / 2차	50%	요구사항 12건 구현 중 6건 일반 기능 시험 완료	잔여 6건 기능 시험과 접근성 점검이 남아 있음
2026-11-08 / 중간 / 3차	75%	요구사항 12건 구현 및 일반 기능 시험	키보드 탐색 오류 D01·D02 미해결

현재 진척

75% 진행 중

원문 기록

전체 진행률

0 / 2 건

개별 실적 ÷ 목표를 표시합니다. 전체 업무 달성률과는 다른 지표입니다.

원문 기록

현안의 발생·해소·잔여 경과

11/03 화면 개발 착수 → 11/06 기능 시험 → 11/08 접근성 오류 2건 미해결. 업무명 불일치는 담당 확인 기록으로 해소한다.

원문 기록

문화시설 통합예약 개선 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

기간	단계 / 할 일	산출물
2026-11-01~11-03	계획·대상 확정	대상 목록
2026-11-04~11-08	현장 이행·증빙 검토	실적 대장
2026-11-10~11-13	보완·관계기관 협의	요청·회신 기록
2026-11-24	결과보고 승인	결재 문서

원문 기록

추후 계획 · 담당·일정·결과물

추후 계획

즉시 | 디지털지원팀 한새봄(가상) | D01·D02 접근성 오류 보완·재시험 및 운영 반영 | 조치 목록 | 원문 후속조치
2026-11-11 | 디지털지원팀 한새봄(가상) | 관계부서 진행 상황 재확인 | 회신 기록 | 내부 관리 목표·대외 기한 변경 아님

원문 기록

남은 업무

D01·D02 접근성 오류 보완·재시험 및 운영 반영

원문 기록

실무 처리 순서

1. 실적대장에서 대상별 접수 여부 확인

원문 기록

완료 판단 기준

남은 이행·증빙 대조·담당 검토·결과 결재가 모두 끝나야 완료로 표시한다. 계획이나 사본 접수만으로 완료 처리하지 않는다.

원문 기록

인계 산출물 · 제공 여부

계획·진행 보고, 실적대장, 담당 확인 기록(합성 자료 제공). 향후 생성할 최종 결재문·재시험 결과는 제공된 증빙으로 표시하지 않는다.

원문 기록

보고·결재 체계

실무 담당 → 팀장 검토 → 과장 승인. 기한·예산 변경은 별도 협의·결재가 필요하다.

원문 기록

자료를 찾고 접근하는 방법

합성 공유함 / CP 사업코드 / 계획·실적·결재. 시연 패키지의 q77.xlsx는 증빙대장, memo.pdf는 동일업무 담당 확인 기록이다.

원문 기록

> **동일 업무 확인 기록**
>
> 예약 화면 이용편의 개선 → 문화시설 통합예약 개선
> memo.pdf에서 CP-002 동일 전체 범위·진행률 기준·담당 확인
>
> 예약포털 접근성 보완 → 문화시설 통합예약 개선
> memo.pdf에서 CP-002 동일 전체 범위·진행률 기준·담당 확인

공통 운영 정보

업무별 예산과 공동 경비

동일 예산코드는 한 번만 합산합니다. 집행액·지급예정액·가용잔액을 구분하며, 예산 집행률은 업무 진척률을 뜻하지 않습니다.

편성액	집행액	지급예정액	가용잔액
400,000,000원	259,000,000원	45,000,000원	96,000,000원

예산 / 명칭	편성액	집행액	지급예정액	가용잔액	연결 업무
CP-B3 보조금 정산 승인	150,000,000원	140,000,000원	0원	10,000,000원	1 원문 기록
CP-COM 공통 회의·자료 관리	10,000,000원	2,000,000원	1,000,000원	7,000,000원	1, 2, 3, 5 원문 기록
CP-B5 공공데이터 개방 품질개선	42,000,000원	21,000,000원	8,000,000원	13,000,000원	2 원문 기록
CP-B1 지역생활서비스 통합지원	120,000,000원	48,000,000원	12,000,000원	60,000,000원	3 원문 기록
CP-B4 공공시설 안전점검	18,000,000원	18,000,000원	0원	0원	4 전임자 입력
CP-B2 문화시설 통합예약 개선	60,000,000원	30,000,000원	24,000,000원	6,000,000원	5 원문 기록

CP-B3 · 보조금 정산 승인



기준일 2026-11-08 · 2026년 사업

CP-COM · 공통 회의·자료 관리



기준일 2026-11-08 · 2026년 사업

CP-B5 · 공공데이터 개방 품질개선



기준일 2026-11-08 · 2026년 사업

CP-B1 · 지역생활서비스 통합지원



기준일 2026-11-08 · 2026년 사업

CP-B4 · 공공시설 안전점검



기준일 2026-11-08 · 2026년 사업

CP-B2 · 문화시설 통합예약 개선



기준일 2026-11-08 · 2026년 사업

■ 짙은 녹색: 집행 / ■ 황색: 지급 예정 / ■ 연녹색: 가용 잔액. 금액은 원문 기준이며 지급 예정은 집행 완료가 아닙니다.

관계자 연락망 · 누구에게 무엇을 확인할까

같은 관계자ID는 하나로 모으고 관련 업무를 함께 표시합니다. 연락처는 원문의 기록이며 변경 시 담당자에게 재확인하세요.

성명 / 소속	역할 / 협의사항	연락처	업무
사업지원팀 박이음(가상) 가상 사업팀	실무 담당 현안·보완·일정	내선 3131(시연용), work3@example.invalid	1 원문 기록
서도윤(가상) 가상 기획재정팀	회계 협의 집행·정산	내선 3190(시연용), finance@example.invalid	1, 2, 3, 4, 5 원문 기록
데이터정책팀 윤다정(가상) 가상 데이터정책팀	실무 담당 개방 품질·이용제한	내선 3151(시연용), work5@example.invalid	2 원문 기록
생활지원팀 김가온(가상) 가상 사업팀	실무 담당 현안·보완·일정	내선 3111(시연용), work1@example.invalid	3 원문 기록
시설관리팀 이한결(가상) 가상 사업팀	실무 담당 현안·보완·일정	내선 3141(시연용), work4@example.invalid	4 원문 기록
디지털지원팀 한새봄(가상) 가상 사업팀	실무 담당 현안·보완·일정	내선 3121(시연용), work2@example.invalid	5 원문 기록

보고·협의 순서

업무	보고·결재 경로
보조금 정산 승인	실무 담당 → 팀장 검토 → 과장 승인. 기한·예산 변경은 별도 협의·결재가 필요하다.
공공데이터 개방 품질개선	실무 담당 → 팀장 검토 → 과장 승인. 기한·예산 변경은 별도 협의·결재가 필요하다.
지역생활서비스 통합지원	실무 담당 → 팀장 검토 → 과장 승인. 기한·예산 변경은 별도 협의·결재가 필요하다.
공공시설 안전점검	실무 담당 → 팀장 검토 → 과장 승인. 기한·예산 변경은 별도 협의·결재가 필요하다.
문화시설 통합예약 개선	실무 담당 → 팀장 검토 → 과장 승인. 기한·예산 변경은 별도 협의·결재가 필요하다.
