업무 인수인계 보고서

한빛시 4개 업무 · 인수인계 상세실무편 (합성 시연)


인계자 김전임 (가상) → 인수자 이후임 (가상)
현안 기준일 2026-11-09 · 확정 판본 b3b24983

한눈에 보는 업무 진행 현황

지금 어디까지 왔고, 다음에 무엇을 해야 하나

현안 판단 기준일 2026-11-09 · 진행률은 각 업무의 최신 보고에 명시된 값입니다. 문서 수·경과 시간으로 계산하지 않습니다.

4	1	1	1
인계 업무	기한 경과 · 이행 확인	7일 이내 처리 기한	전체 업무 완료

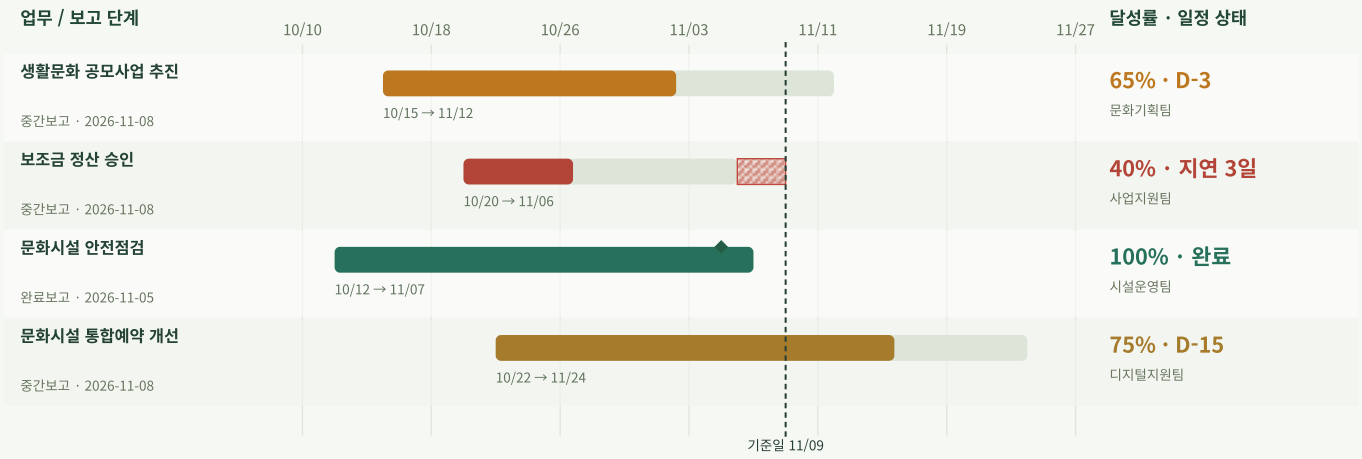

달성률은 기간 경과율이 아닙니다. 지연은 확정 기준일에 기한이 지났고 최신 보고상 미완료인 업무의 경과 일수이며 실제 이행 여부는 담당자가 확인합니다.

업무 / 현재 단계	보고 진행률 / 기한	업무 현안	남은 일 / 바로 할 일
생활문화 공모사업 추진 신청 검토 및 심사 준비 중간 · 3개 보고 연결	65% 기한 3일 남음 기한 2026-11-12 담당 문화기획팀	심사자료 2건 보완 미접수	**11월 12일 심사 개최와 선정 결과 결재** 다음: 11월 10일까지 보완자료 요청 후 심사자료 배포
보조금 정산 승인 증빙 보완 대기로 승인 지연 중간 · 3개 보고 연결	40% 기한 3일 경과 · 이행 확인 기한 2026-11-06 담당 사업지원팀	2개 단체 영수증 누락으로 11월 6일 승인 기한 경과	**누락 증빙 보완 후 6개 단체 검토와 승인** 다음: 누락 영수증을 즉시 요청하고 승인 일정 재협의
문화시설 안전점검 업무 완료 완료 · 3개 보고 연결	100% 업무 완료 기한 2026-11-07 담당 시설운영팀	해소 완료: 유도등 2개 교체 확인	**없음** 다음: 점검 결과서를 보관하고 다음 정기 점검 때 참고
문화시설 통합예약 개선 사용자 시험 중 중간 · 2개 보고 연결	75% 업무 장애·미결 현안 기한 2026-11-24 담당 디지털지원팀	키보드 탐색 오류 2건 미해결	**접근성 오류 수정 후 운영 반영** 다음: 개발사에 오류 재현 절차 전달 후 재시험

우선순위와 실행 순서

기한이 지났거나 임박한 업무, 진행을 막는 실제 현안을 먼저 처리합니다. 자료의 불일치는 마지막 참고란에서 확인합니다.

02 보조금 정산 승인

기한 3일 경과 · 이행 확인 · 사업지원팀 · 2026-11-06

2개 단체 영수증 누락으로 11월 6일 승인 기한 경과

바로 할 일 누락 영수증을 즉시 요청하고 승인 일정 재협의

원문 기록 [83]

01 생활문화 공모사업 추진

기한 3일 남음 · 문화기획팀 · 2026-11-12

심사자료 2건 보완 미접수

바로 할 일 11월 10일까지 보완자료 요청 후 심사자료 배포

원문 기록 [14]

04 문화시설 통합예약 개선

업무 장애·미결 현안 · 디지털지원팀 · 2026-11-24

키보드 탐색 오류 2건 미해결

바로 할 일 개발사에 오류 재현 절차 전달 후 재시험

원문 기록 [222]

03 문화시설 안전점검

업무 완료 · 시설운영팀 · 2026-11-07

해소 완료: 유도등 2개 교체 확인

바로 할 일 점검 결과서를 보관하고 다음 정기 점검 때 참고

원문 기록 [152]

인수 당일 확인 · 시스템 권고

자료 열람 확인 → 기한 경과·임박 업무 담당과 일정 대조 → 필요한 자료 요청 → 인수 확인 기록. 향후 산출물은 이미 존재하는 문서로 처리하지 않습니다.

생활문화 공모사업 추진

> **문화기획팀 · 기한 2026-11-12 · 기한 3일 남음 · 보고 달성률 65%**

업무 개요

생활문화 단체의 공모 신청을 접수·심사하여 2027년 지원 대상을 선정하는 업무다. 이번 인계 범위는 선정 결과 결재까지이며, 이후 교부·사업 집행은 다음 단계로 별도 관리한다.

원문 기록 [18]

목표

신청 20건을 동일 심사 기준으로 검토하고 지원 대상 8개 단체를 선정하는 것이 목표다. 2026-11-12 심사 개최·선정 결과 결재를 완료하고 심사 기록을 남긴다. 선정 수는 목표이며 현재 선정 완료 건수는 0건이다.


원문 기록 [16]

인계 범위

공고·설명회 → 신청 접수 → 자격 검토 → 심사자료 보완·배포 → 심사 → 선정 결과 결재. 교부금 지급과 선정 이후 사업 집행은 이 업무의 완료 범위에 포함하지 않는다.

원문 기록 [22]

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-10-15 / 계획	10%	사업 범위와 심사 기준 초안 작성	없음
2026-10-26 / 착수	35%	공고 게시와 설명회 개최	심사위원 1명 섭외 대기
2026-11-08 / 중간	65%	신청 20건 접수와 자격 검토 완료	심사자료 2건 보완 미접수

현재 진척

신청 검토 및 심사 준비

원문 기록 [23]

신청 접수
20 / 20 건

자격 검토
20 / 20 건

선정 결재
0 / 8 단체

개별 실적 ÷ 목표를 표시합니다. 전체 업무 달성률과는 다른 지표입니다.

원문 기록 [20]

현안의 발생·해소·잔여 경과

10/26 심사위원 1명 섭외 대기 → 11/07 위원 수락 확인으로 해소(08_실행증빙대장.xlsx / 위원확정). 11/08 A07·A14 심사자료 보완 미접수는 계속 미해결이다. 보완 수령 전에는 심사자료 완결로 표시하지 않는다.

원문 기록 [12]

생활문화 공모사업 추진 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

기간	단계 / 할 일	산출물
2026-10-15~10-25	사업 범위·심사 기준 수립	계획서·심사표
2026-10-26~11-05	공고·설명회·신청 접수	공고문·접수대장
2026-11-06~11-10	자격 검토·보완·자료 배포	검토대장·배포본
2026-11-12	심사 개최·선정 결과 결재	심사기록·선정 결재문

원문 기록 [11]

추후 계획 · 담당·일정·결과물

시점	담당	구체적 조치	남길 결과물	일정의 성격
2026-11-09	문화기획팀 김가온	A07·A14 보완요청 이력 점검·대상 재통보	보완요청대장	실행 예정
2026-11-10	문화기획팀 김가온	보완자료 2건 수령·대조 후 심사자료 배포	접수 확인·배포본	원문 목표
2026-11-12	문화기획팀 김가온	심사 개최·결과 결재 상신	심사기록·결재문	원문 기한
2026-11-13	문화기획팀 윤서연	선정 이후 교부 업무 담당에게 결과 전달	전달 기록	내부 계획

원문 기록 [10]

남은 업무

11월 12일 심사 개최와 선정 결과 결재

원문 기록 [21]

실무 처리 순서

1. 08_실행증빙대장.xlsx의 공모접수 시트에서 A01~A20 자격 검토를 확인한다.
2. A07·A14의 미비자료를 요청하고 수령 시 파일명·확인자를 대장에 기록한다.
3. 보완자료를 포함한 심사자료와 11/07 확정된 위원 명단을 대조해 배포한다.
4. 심사기록과 선정 명단을 문화정책과장에게 상신한다.
5. 결재번호·결과 파일을 기록하고 교부 담당에게 넘긴다.

원문 기록 [17]

완료 판단 기준

20건 자격 검토, 보완자료 2건 수령, 심사 개최 기록, 선정 결과 결재 문서가 모두 확보되어야 이 업무를 완료로 처리한다. 선정 후 교부금 지급까지 완료했다는 뜻은 아니다.

원문 기록 [5]

인계 산출물 · 제공 여부

공모접수·보완대장(제공) / 심사위원 확정대장(제공) / 심사기준 초안(계획보고에 기재) / 심사 배포본·심사기록·선정 결재문(향후 생성 예정)

원문 기록 [7]

보고·결재 체계

실무 문화기획팀 김가온(가상) → 팀장 검토 → 문화정책과장 승인. 예산 변경은 회계 협의 후 별도 승인한다. 대체 담당은 윤서연(가상)이며 이 경로는 합성 기관의 시연 규칙이다.

원문 기록 [1]

자료를 찾고 접근하는 방법

패키지 최상위의 01~04 진행보고, 06_업무실무기준정보.xlsx, 07_공통예산연락망.xlsx, 08_실행증빙대장.xlsx에서 HB-001를 조회한다. 앱에서는 업무자료 → 해당 파일 → 본문 보기/원본 받기를 사용한다. 첨부가 없는 예정 산출물은 인계 산출물에 구분했다. 접근 문제는 행정지원팀 강온유에게 요청한다.

원문 기록 [8]

보조금 정산 승인

> **사업지원팀 · 기한 2026-11-06 · 기한 3일 경과 · 이행 확인 · 보고 달성률 40%**

업무 개요

전년도 생활문화 보조사업을 수행한 10개 단체의 정산서를 받아 증빙과 지출 적정성을 검토하고 최종 승인하는 업무다. 정산서 접수, 증빙 완비, 검토, 승인 상태를 각각 관리한다.

원문 기록 [87]

목표

대상 10개 단체 모두에 대해 적정성 검토와 정산 승인을 완료하고 승인·반납 필요 여부를 기록한다. 11/06 승인 기한을 지났으므로 누락 증빙 확보와 승인 재일정 협의가 현재 우선 과제다.


원문 기록 [85]

인계 범위

정산서 접수 → 증빙 대조 → 보완 요청 → 적정성 검토 → 승인 결재. 보조금은 이미 교부됐으며 정산 진행률과 예산 집행률은 서로 다른 지표다.

원문 기록 [91]

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-10-20 / 계획	0%	제출 목록과 검토 기준 작성	없음
2026-10-28 / 착수	20%	10개 단체 중 6개 단체 정산서 접수	4개 단체 자료 미접수
2026-11-08 / 중간	40%	10개 단체 정산서 접수 및 4개 단체 검토 완료	2개 단체 영수증 누락으로 11월 6일 승인 기한 경과

현재 진척

증빙 보완 대기로 승인 지연

원문 기록 [92]

정산서 접수
10 / 10 단체

적정성 검토
4 / 10 단체

최종 승인
0 / 10 단체

개별 실적 ÷ 목표를 표시합니다. 전체 업무 달성률과는 다른 지표입니다.

원문 기록 [89]

현안의 발생·해소·잔여 경과

10/28 정산서 4개 단체 미접수 → 11/08 10개 단체 정산서 접수로 해소. G05·G06 영수증 누락, 잔여 6개 단체 검토, 최종 승인 0건은 미해결이다. 11/10 재일정 협의는 예정이며 기한 연장 승인으로 취급하지 않는다.

원문 기록 [81]

보조금 정산 승인 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

기간	단계 / 할 일	산출물
2026-10-20~10-27	기준·제출 목록 안내	정산 안내문
2026-10-28~11-02	정산서 접수·미제출 독려	단체별 접수대장
2026-11-03~11-06	증빙·적정성 검토 및 승인	검토표·승인문
2026-11-09 이후	지연 정상화·재일정 협의	보완자료·협의기록

원문 기록 [80]

추후 계획 · 담당·일정·결과물

시점	담당	구체적 조치	남길 결과물	일정의 성격
즉시	사업지원팀 박이음	G05·G06 누락 영수증 재요청	요청·회신 기록	원문 조치
2026-11-10	사업지원팀 박이음	승인 지연 경위 보고와 재일정 협의	협의 기록	내부 관리 목표·기한 변경 미승인
2026-11-11~11-13	사업지원팀 최다온	잔여 6개 단체 검토·보완 대조	단체별 검토표	증빙 수령 전제 잠정 계획
검토 완료 후	사업지원팀 박이음	최종 승인 결재 상신	승인 문서	실제 완료일 미확정

원문 기록 [79]

남은 업무

누락 증빙 보완 후 6개 단체 검토와 승인

원문 기록 [90]

실무 처리 순서

1. 08_실행증빙대장.xlsx의 정산검토 시트에서 G01~G10을 확인한다.
2. 접수 10건과 검토 완료 4건을 구분하고 G05·G06 영수증 누락을 먼저 처리한다.
3. G07~G10의 검토 대기와 G05·G06의 증빙 보완 대기를 구분해 작업 순서를 정한다.
4. 회계협의 담당에게 쟁점과 새 일정안을 전달하고 사업지원과장에게 보고한다.
5. 검토표와 승인 결재를 모두 확보한 뒤 승인 상태를 갱신한다.

원문 기록 [86]

완료 판단 기준

누락 영수증 확보, 10개 단체 적정성 검토, 최종 승인 결재 및 결과 통지가 모두 기록돼야 완료다. 재일정이 승인되기 전에는 당초 11/06 기한을 유지한다.

원문 기록 [74]

인계 산출물 · 제공 여부

단체별 정산·검토대장(제공) / G05·G06 보완요청 목록(제공) / 개별 영수증 원본·최종 승인문(아직 미확보 또는 생성 전으로 명시)

원문 기록 [76]

보고·결재 체계

실무 사업지원팀 박이음(가상) → 팀장 검토 → 사업지원과장 승인. 예산 변경은 회계 협의 후 별도 승인한다. 대체 담당은 최다온(가상)이며 이 경로는 합성 기관의 시연 규칙이다.

원문 기록 [70]

자료를 찾고 접근하는 방법

패키지 최상위의 01~04 진행보고, 06_업무실무기준정보.xlsx, 07_공통예산연락망.xlsx, 08_실행증빙대장.xlsx에서 HB-002를 조회한다. 앱에서는 업무자료 → 해당 파일 → 본문 보기/원본 받기를 사용한다. 첨부가 없는 예정 산출물은 인계 산출물에 구분했다. 접근 문제는 행정지원팀 강온유에게 요청한다.

원문 기록 [77]

문화시설 안전점검

시설운영팀 · 기한 2026-11-07 · 업무 완료 · 보고 달성률 100%

업무 개요

문화시설 5곳을 점검하고 발견된 보수 8건을 조치한 뒤 재점검과 결과 결재로 종료한 업무다. 인수자는 완료 작업을 반복하기보다 완료 증빙의 열람 가능 여부와 다음 정기점검 연계를 확인한다.

원문 기록 [156]

목표

대상 시설 5곳 점검과 보수 8건을 모두 마치고 최종 결과 결재를 남긴다. 11/05 실제 완료로 보고했으며 다음 정기점검은 2027-02-05로 내부 계획에 등록했다.


원문 기록 [154]

인계 범위

대상·점검표 확정 → 현장 점검 → 보수 → 재점검 → 결과 결재·보관. 차기 점검 주기는 이 합성 기관의 내부 계획이며 법정 주기를 의미하지 않는다.

원문 기록 [160]

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-10-12 / 계획	10%	대상 시설과 점검표 확정	없음
2026-10-25 / 착수	70%	시설 5곳 점검 및 보수 8건 중 6건 처리	지하 비상구 유도등 2개 고장
2026-11-05 / 완료	100%	유도등 교체와 재점검 및 최종 결과 결재 완료	해소 완료: 유도등 2개 교체 확인

현재 진척

업무 완료

원문 기록 [161]

시설 점검
5 / 5 곳

보수 조치
8 / 8 건

결과 결재
1 / 1 건

개별 실적 ÷ 목표를 표시합니다. 전체 업무 달성률과는 다른 지표입니다.

원문 기록 [158]

현안의 발생·해소·잔여 경과

10/25 지하 비상구 유도등 2개 고장 → R07·R08 교체 및 11/05 재점검으로 해소. 현재 미결 보수는 없다. 사진 미첨부는 자료 참고 사항이며 진행 장애 현안으로 분류하지 않는다.

원문 기록 [150]

문화시설 안전점검 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

기간	단계 / 할 일	산출물
2026-10-12~10-24	대상·점검표 확정	시설목록·점검표
2026-10-25~11-04	현장 점검·보수·재점검	점검·보수 기록
2026-11-05	최종 결과 결재	안전점검 결과대장
2027-02-05	차기 정기점검	내부 일정 등록

원문 기록 [149]

추후 계획 · 담당·일정·결과물

시점	담당	구체적 조치	남길 결과물	일정의 성격
인계 당일	시설운영팀 이한결	F01~F05·R01~R08 완료대장 열람 확인	인수 확인 기록	완료 증빙 인수
2026-11-13	시설운영팀 정하람	차기 점검 알림·담당 등록 점검	점검 일정대장	내부 계획
2027-02-05	시설운영팀 정하람	이전 보수 이력을 반영한 정기점검	차기 점검표	내부 계획

원문 기록 [148]

남은 업무

없음

원문 기록 [159]

실무 처리 순서

1. 08_실행증빙대장.xlsx의 시설점검·보수내역 시트를 연다.
2. F01~F05와 R01~R08의 완료·재점검 기록을 대조한다.
3. R07·R08 유도등 교체 및 11/05 재점검 결과를 확인한다.
4. 결과 결재대장의 HB-003-20261105를 확인하고 접근 경로를 인수자에게 안내한다.
5. 다음 점검 알림에 지하 비상구 이력을 연결한다.

원문 기록 [155]

완료 판단 기준

11/05 완료보고와 점검·보수·결재대장의 일치로 완료 상태를 확인한다. 후임자의 남은 일은 완료 증빙 인수와 차기 점검 준비이며 현재 사업을 미완료로 재분류하지 않는다.

원문 기록 [143]

인계 산출물 · 제공 여부

시설 5곳 점검대장·보수 8건 기록·결과 결재대장(합성 기록 제공) / 현장 사진은 이 시연 패키지에 포함하지 않으며 현장 증빙 원본으로 오인하지 않는다.

원문 기록 [145]

보고·결재 체계

실무 시설운영팀 이한결(가상) → 팀장 검토 → 시설관리과장 승인. 예산 변경은 회계 협의 후 별도 승인한다. 대체 담당은 정하람(가상)이며 이 경로는 합성 기관의 시연 규칙이다.

원문 기록 [139]

자료를 찾고 접근하는 방법

패키지 최상위의 01~04 진행보고, 06_업무실무기준정보.xlsx, 07_공통예산연락망.xlsx, 08_실행증빙대장.xlsx에서 HB-003를 조회한다. 앱에서는 업무자료 → 해당 파일 → 본문 보기/원본 받기를 사용한다. 첨부가 없는 예정 산출물은 인계 산출물에 구분했다. 접근 문제는 행정지원팀 강은유에게 요청한다.

원문 기록 [146]

문화시설 통합예약 개선

> **디지털지원팀 · 기한 2026-11-24 · 업무 장애·미결 현안 · 보고 달성률 75%**

업무 개요

문화시설 통합예약의 요구사항 12건을 구현하고 접근성 오류를 제거한 뒤 운영 환경에 반영하는 개선 업무다. 예약포털 접근성 보완 중간보고는 같은 사업의 전체 범위를 보고한 별칭 문서이며, 담당자 확인 기록에 따라 연결한다.

원문 기록 [226]

목표

요구사항 12건 구현, 키보드 탐색 오류 2건 해소·재시험, 운영 반영 승인 기록 확보가 목표다. 최종 기한은 11/24이며 화면 개발·일반 기능 시험 완료만으로 전체 완료 처리하지 않는다.


원문 기록 [224]

인계 범위

요구사항·화면 초안 → 개발 → 일반 기능 시험 → 접근성 보완·재시험 → 운영 승인·반영. 09_업무동일성_담당확인.txt는 두 보고의 진행률이 동일한 전체 업무 범위임을 명시한다.

원문 기록 [230]

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-10-22 / 계획	20%	요구사항 12건 정리와 화면 초안 작성	없음
2026-11-08 / 중간	75%	예약 화면 개발과 기능 시험 완료	키보드 탐색 오류 2건 미해결

현재 진척

사용자 시험 중

원문 기록 [231]

요구사항 구현
12 / 12 건

접근성 결함 해결
0 / 2 건

운영 반영
0 / 1 건

개별 실적 ÷ 목표를 표시합니다. 전체 업무 달성률과는 다른 지표입니다.

원문 기록 [228]

현안의 발생·해소·잔여 경과

10/22 계획 단계 현안 없음 → 11/08 D01·D02 키보드 탐색 오류 발견·미해결. 11/09 동일 업무·담당·진행률 기준을 확인했으며 실제 연결은 전임자 검토·매칭으로 기록한다.

원문 기록 [220]

문화시설 통합예약 개선 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

기간	단계 / 할 일	산출물
2026-10-22~10-28	요구사항·개발 범위 확정	Q01~Q12 명세
2026-10-29~11-08	개발·일반 기능 시험	기능 시험대장
2026-11-09~11-20	접근성 보완·재시험	D01·D02 결함대장
2026-11-24	운영 승인·반영	운영 반영 기록

원문 기록 [219]

추후 계획 · 담당·일정·결과물

시점	담당	구체적 조치	남길 결과물	일정의 성격
즉시	디지털지원팀 한새봄	D01·D02 재현 절차를 개발사에 전달	접수 회신	원문 조치
2026-11-16	개발사 오누리	수정 버전 제출	변경내역·시험용 버전	개발 협의 목표
2026-11-20	디지털지원팀 문지우	키보드만으로 2건 재시험	결함별 시험 결과	내부 검수 목표
2026-11-24	디지털지원팀 한새봄	검수 결과 보고·운영 반영 승인	승인·배포 기록	원문 기한

원문 기록 [218]

남은 업무

접근성 오류 수정 후 운영 반영

원문 기록 [229]

실무 처리 순서

1. 09_업무동일성_담당확인.txt를 대조하고 두 업무 후보를 사람이 매칭한다.
2. 08_실행증빙대장.xlsx의 요구사항·접근성결함 시트에서 Q01~Q12 및 D01·D02를 확인한다.
3. D01은 날짜 선택 후 초점 이탈, D02는 확인 창의 키보드 닫기 실패로 재현한다.
4. 수정 버전에서 동일 절차를 키보드만으로 반복하고 두 건 모두 통과해야 검수한다.
5. 디지털정책과장 승인과 운영 반영 기록을 남긴 뒤 전체 완료로 갱신한다.

원문 기록 [225]

완료 판단 기준

요구사항 12건 구현, D01·D02 재시험 통과, 운영 반영 승인·배포 기록을 모두 확인해야 완료다. 개발사 수정 제출은 검수 통과나 운영 완료와 다르다.

원문 기록 [213]

인계 산출물 · 제공 여부

요구사항 12건·접근성 결함 2건 대장·동일업무 확인 기록(제공) / 수정 버전·재시험 결과·운영 승인문(향후 생성 예정)

원문 기록 [215]

보고·결재 체계

실무 디지털지원팀 한새봄(가상) → 팀장 검토 → 디지털정책과장 승인. 예산 변경은 회계 협의 후 별도 승인한다. 대체 담당은 문지우(가상)이며 이 경로는 합성 기관의 시연 규칙이다.

원문 기록 [209]

자료를 찾고 접근하는 방법

패키지 최상위의 01~04 진행보고, 06_업무실무기준정보.xlsx, 07_공통예산연락망.xlsx, 08_실행증빙대장.xlsx에서 HB-004를 조회한다. 앱에서는 업무자료 → 해당 파일 → 본문 보기/원본 받기를 사용한다. 첨부가 없는 예정 산출물은 인계 산출물에 구분했다. 접근 문제는 행정지원팀 강온유에게 요청한다.

원문 기록 [216]

> **동일 업무 확인 기록**
>
> 예약포털 접근성 보완 → 문화시설 통합예약 개선
> 합성 시연: 09_업무동일성_담당확인.txt의 확인자 기록을 대조. 같은 전체 사업 범위의 계획 20% → 중간 75% 보고이며 담당은 디지털지원팀으로 확인하여 연결.

업무별 예산과 공동 경비

동일 예산코드는 한 번만 합산합니다. 집행액·지급예정액·가용잔액을 구분하며, 예산 집행률은 업무 진척률을 뜻하지 않습니다.

편성액	집행액	지급예정액	가용잔액
358,000,000원	212,000,000원	33,000,000원	113,000,000원

예산 / 명칭	편성액	집행액	지급예정액	가용잔액	연결 업무
B-001 생활문화 공모사업 추진	120,000,000원	12,000,000원	8,000,000원	100,000,000원	1 원문 기록 [2]
B-COM 공통 회의·자료 관리	10,000,000원	2,000,000원	1,000,000원	7,000,000원	1, 2, 3, 4 원문 기록 [2] [71] [140] [210]
B-002 보조금 정산 승인	150,000,000원	150,000,000원	0원	0원	2 원문 기록 [71]
B-003 문화시설 안전점검	18,000,000원	18,000,000원	0원	0원	3 원문 기록 [140]
B-004 문화시설 통합예약 개선	60,000,000원	30,000,000원	24,000,000원	6,000,000원	4 원문 기록 [210]

B-001 · 생활문화 공모사업 추진



기준일 2026-11-09 · HB-001

B-COM · 공통 회의·자료 관리



기준일 2026-11-09 · 전체 4개 업무 공동 사용·중복 합산 금지

B-002 · 보조금 정산 승인



기준일 2026-11-09 · HB-002

B-003 · 문화시설 안전점검



기준일 2026-11-09 · HB-003

B-004 · 문화시설 통합예약 개선



기준일 2026-11-09 · HB-004

■ 짙은 녹색: 집행 / ■ 황색: 지급 예정 / ■ 연녹색: 가용 잔액. 금액은 원문 기준이며 지급 예정은 집행 완료가 아닙니다.

관계자 연락망 · 누구에게 무엇을 확인할까

같은 관계자ID는 하나로 모으고 관련 업무를 함께 표시합니다. 연락처는 원문의 기록이며 변경 시 담당자에게 재확인하세요.

성명 / 소속	역할 / 협의사항	연락처	업무
김가온(가상) 문화기획팀	실무 담당 업무 현황·보완·인계	내선 2111(시연용), lead1@example.invalid	1 원문 기록 [6]
윤서연(가상) 문화기획팀	대체 담당 담당 부재 시 자료·일정 확인	내선 2112(시연용), backup1@example.invalid	1 원문 기록 [6]
서도윤(가상) 행정지원팀	회계 협의 집행·지급예정·정산 쟁점	내선 2190(시연용), finance@example.invalid	1, 2, 3, 4 원문 기록 [6] [75] [144] [214]
강온유(가상) 행정지원팀	문서 접근 지원 패키지 파일 열람·권한 요청	내선 2191(시연용), records@example.invalid	1, 2, 3, 4 원문 기록 [6] [75] [144] [214]
박이음(가상) 사업지원팀	실무 담당 업무 현황·보완·인계	내선 2121(시연용), lead2@example.invalid	2 원문 기록 [75]
최다온(가상) 사업지원팀	대체 담당 담당 부재 시 자료·일정 확인	내선 2122(시연용), backup2@example.invalid	2 원문 기록 [75]
이한결(가상) 시설운영팀	실무 담당 업무 현황·보완·인계	내선 2131(시연용), lead3@example.invalid	3 원문 기록 [144]
정하람(가상) 시설운영팀	대체 담당 담당 부재 시 자료·일정 확인	내선 2132(시연용), backup3@example.invalid	3 원문 기록 [144]
한새봄(가상) 디지털지원팀	실무 담당 업무 현황·보완·인계	내선 2141(시연용), lead4@example.invalid	4 원문 기록 [214]
문지우(가상) 디지털지원팀	대체 담당 담당 부재 시 자료·일정 확인	내선 2142(시연용), backup4@example.invalid	4 원문 기록 [214]
오누리(가상) 가상 누리개발	개발사 담당 D01·D02 수정 버전·재현 회신	내선 2143(시연용), vendor@example.invalid	4 원문 기록 [214]

보고·협의 순서

업무	보고·결재 경로
생활문화 공모사업 추진	실무 문화기획팀 김가온(가상) → 팀장 검토 → 문화정책과장 승인. 예산 변경은 회계 협의 후 별도 승인한다. 대체 담당은 윤서연(가상)이며 이 경로는 합성 기관의 시연 규칙이다.
보조금 정산 승인	실무 사업지원팀 박이음(가상) → 팀장 검토 → 사업지원과장 승인. 예산 변경은 회계 협의 후 별도 승인한다. 대체 담당은 최다온(가상)이며 이 경로는 합성 기관의 시연 규칙이다.
문화시설 안전점검	실무 시설운영팀 이한결(가상) → 팀장 검토 → 시설관리과장 승인. 예산 변경은 회계 협의 후 별도 승인한다. 대체 담당은 정하람(가상)이며 이 경로는 합성 기관의 시연 규칙이다.
문화시설 통합예약 개선	실무 디지털지원팀 한새봄(가상) → 팀장 검토 → 디지털정책과장 승인. 예산 변경은 회계 협의 후 별도 승인한다. 대체 담당은 문지우(가상)이며 이 경로는 합성 기관의 시연 규칙이다.

원본 자료 색인 · 인계 범위

본문의 [번호]는 아래 원문 인용과 연결됩니다. 진행보고, 기준정보, 증빙대장은 역할이 다릅니다. 증빙대장은 열람·검색 대상으로 보존하며 독립 업무를 생성하지 않습니다.

원본 파일	처리 범위 / 본문 근거 번호
01_01_생활문화 공모사업 추진_계획보고.docx	원문 인용 검증 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
01_02_생활문화 공모사업 추진_착수보고.xlsx	원문 인용 검증 25, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
01_03_생활문화 공모사업 추진_중간보고.pdf	원문 인용 검증 3, 4, 9, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 26, 64, 65, 66, 67, 68, 69
02_01_보조금 정산 승인_계획보고.docx	원문 인용 검증 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
02_02_보조금 정산 승인_착수보고.xlsx	원문 인용 검증 94, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
02_03_보조금 정산 승인_중간보고.pdf	원문 인용 검증 72, 73, 78, 82, 83, 84, 88, 90, 92, 95, 133, 134, 135, 136, 137, 138
03_01_문화시설 안전점검_계획보고.docx	원문 인용 검증 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
03_02_문화시설 안전점검_착수보고.xlsx	원문 인용 검증 163, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
03_03_문화시설 안전점검_완료보고.pdf	원문 인용 검증 141, 142, 147, 151, 152, 153, 157, 159, 161, 164, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
04_01_문화시설 통합예약 개선_계획보고.docx	원문 인용 검증 227, 232, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
04_02_예약포털 접근성 보완_중간보고.txt	원문 인용 검증 211, 212, 217, 221, 222, 223, 229, 231, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
06_업무실무기준정보.xlsx	원문 인용 검증 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 74, 76, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 89, 91, 96, 143, 145, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 158, 160, 165, 213, 215, 218, 219, 220, 224, 225, 226, 228, 230, 233
07_공통예산연락망.xlsx	원문 인용 검증 1, 2, 6, 8, 28, 70, 71, 75, 77, 97, 139, 140, 144, 146, 166, 209, 210, 214, 216, 234
08_실행증빙대장.xlsx	열람·검색용 증빙대장
09_업무동일성_담당확인.txt	원문 인용 검증 235

인수 확인 체크리스트 · 시스템 권고

- 전체 업무의 현황·기한·다음 조치를 이해했는지 확인
- 예산 코드와 기준일, 지급 예정과 가용 잔액을 대조
- 관계자 연락처와 대체 담당 확인
- 제공된 자료의 열람 확인, 향후 산출물의 담당·작성 시점 확인
- 확정 판본을 양측이 확인하고 앱에서 인수 확인 기록

보고서 확정은 미래 업무의 완료나 기관의 전자결재를 의미하지 않습니다.

확정 시각 2026-11-09T12:00:54.763935+00:00
판본 b3b24983075b43b78bb43c058d554ac3
내용 해시 4f7c497de4099648ca3c4d6cd864f6a2a9de4b0bbea4263801572c645bf00385
분석 모델 solar-pro4
