주택공급 정책 추진현황 보고서

9·7 주택공급 확대방안

보고 기준일
2026-10-23

보고기간
2026-01-01 ~ 2026-10-23

적용 지역
정책 전체

집계대상
21개 프로그램 · 177개 사업

데이터 최종 수집일
2026-10-23 12:45:35 (한국시간)

최신 원천 판본 등록일
2026-10-23 00:53:25 (한국시간)

생성일 / 출처
2026-10-23 12:57:43 Asia/Seoul / the주택

핵심 요약

□ 2026-10-23 현재 9·7 주택공급 확대방안의 관리대상 177개 사업 중 착공 누적 도달량은 81,131호, 도래 관리목표 달성률은 산정 불가입니다.

○ 연말 누적 착공 예상은 117,392호입니다. 계획 일정에 따른 관리 전망이며 실현 확률을 반영한 통계 예측이 아닙니다.

○ 착공 수치 중 원천 사건 3,116호, 담당자 채택 8,029호, 단계 추정 69,986호, 후행 도달 근거 0호입니다.

목표·현재 도달량·전망

지표	도래 목표	현재 누적	달성률	연말 누적 전망
사업화	151,044호	152,802호	산정 불가	174,394호
인허가	98,097호	99,462호	산정 불가	126,852호
착공	79,829호	81,131호	산정 불가	117,392호
공급·분양	57,002호	35,410호	산정 불가	68,267호
준공	5,489호	697호	산정 불가	7,816호
입주	미확보	미확보	산정 불가	3,845호

목표·도달·전망은 서로 다른 지표입니다. 채택·추정 구성은 1장, 개별 사업과 원천은 붙임에서 확인합니다.


목차

1. 주택공급 정책 추진현황 총괄
2. 공급유형별 착공 추진현황
3. 주요 사업별 추진상황
4. 분양·임대 공급 추진현황
5. 준공·입주 추진현황 및 전망
6. 정책·프로그램별 과제 이행현황
7. 향후 주요 일정 및 중점 관리사항

붙임 1~3은 별도 자료입니다. 보고서 화면의 ‘붙임 자료 생성·다운로드’에서 받을 수 있습니다.

단계별 관리목표·도달량·연말 전망

단위: 호 · 단계 간 합산 금지

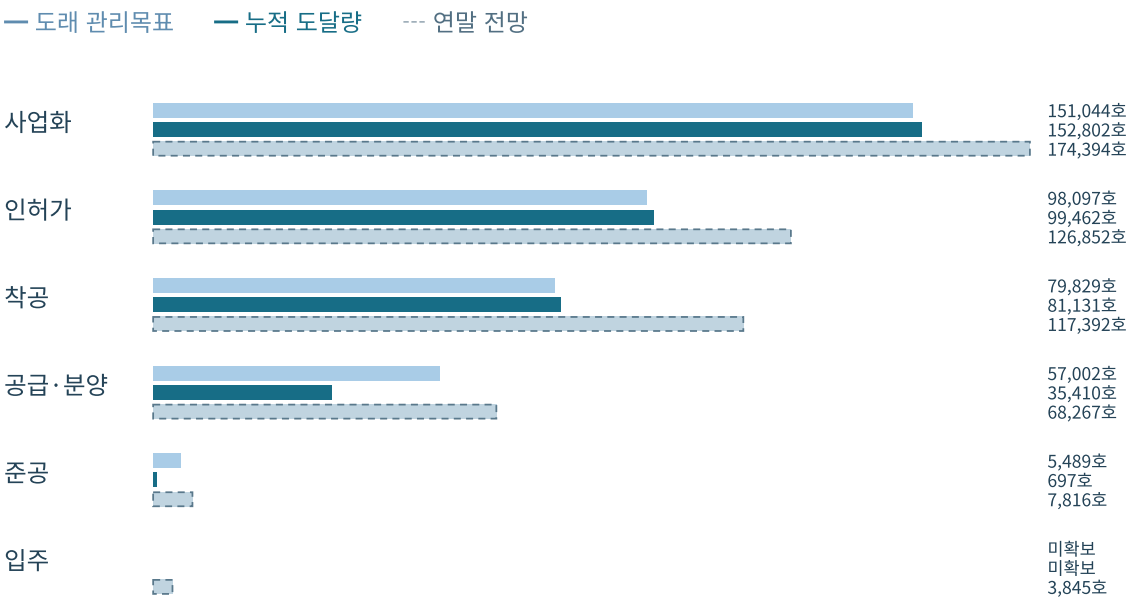

1. 주택공급 정책 추진현황 총괄

□ 비교 가능한 목표·도달량이 없어 최저 달성 단계를 산정하지 않습니다.

○ 물량 변경·원인 분석은 변경 전후 판본이 연결된 경우에만 확정합니다. 이번 보고서에 과거 보고서 기준본이 연결되지 않은 경우 전월 대비 개선·악화 판단을 보류합니다.

정책 목표 및 관리 범위

항목	내용
정책 / 발표일	9·7 주택공급 확대방안 / 2025-09-07
정책 전체 목표	1,350,000호 · 착공
목표기간	2026-01-01 ~ 2030-12-31
선택 범위	정책 전체
연결 프로그램 / 관리사업	21개 / 177개
공급유형	공공주택 · 유형 미확인·복합 · 민간 정비사업
후속 정책과의 관계	선택 정책의 원문 목표 유지 · 후속 정책 통합목표와 합산하지 않음

단계별 추진실적

누적 도달량은 이전 연도 포함. 단계 간 합산 금지. 달성률의 분모는 연결 사업의 기준일까지 도래한 관리목표이며 정책 전체 목표와 다릅니다. 미확보 사업은 합계에서 제외되므로 확보 범위를 함께 확인하세요.

단계	도래 관리목표	누적 도달량	달성률	잔여 목표	연말 누적 예상
사업화	151,044호	152,802호	산정 불가	미확보	174,394호
인허가	98,097호	99,462호	산정 불가	미확보	126,852호
착공	79,829호	81,131호	산정 불가	미확보	117,392호
공급·분양	57,002호	35,410호	산정 불가	미확보	68,267호
준공	5,489호	697호	산정 불가	미확보	7,816호
입주	미확보	미확보	산정 불가	미확보	3,845호

누적 도달량 구성

동일 사업에서 원천 사건 → 담당자 채택 → 추정 → 후행 근거 순으로 추가 도달분만 배분합니다. 후행 단계로 입주를 생성하지 않습니다.

단계	원천 사건	담당자 채택	단계 추정	후행 도달 근거	확인 필요	확보 사업
사업화	0호	0호	147,491호	5,311호	0호	176/177
인허가	0호	34,336호	59,297호	5,821호	8호	155/177
착공	3,116호	8,029호	69,986호	0호	0호	120/177
공급·분양	3,389호	27,224호	4,797호	0호	0호	65/177

단계	원천 사건	담당자 채택	단계 추정	후행 도달 근거	확인 필요	확보 사업
준공	0호	697호	0호	0호	0호	2/177
입주	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보	0/177

목표·실적 비교 범위 및 확보 부분

전체 달성률은 동일 모집단의 목표·실적이 모두 확보된 경우에 계산합니다. 확보 부분 달성률을 전체 달성률로 확대하지 않습니다. 추정·담당자 채택값은 기존 관리 도달량으로 보존합니다.

단계	도래 목표 사업	실적 미확보	목표 미확보 도달사업	비교가능 목표 / 도달	확보 부분 달성률
사업화	175	1	2	150,444호 / 150,444호	100.0%
인허가	154	2	2	96,586호 / 96,586호	100.0%
착공	122	5	1	77,026호 / 77,026호	100.0%
공급·분양	96	33	0	35,868호 / 34,542호	96.3%
준공	10	8	0	697호 / 697호	100.0%
입주	0	0	0	미확보 / 미확보	산정 불가

2. 공급유형별 착공 추진현황

공급유형별 금년 착공

연간 증가는 같은 원장에서 연초 전 누적을 뺀 값입니다. 추정 포함 관리 도달량이며 실제 착공 사건과 구성표에서 구분합니다. 유형별 전망은 각 유형 내부 산식으로 계산하여 전체 전망과 단순 합산하지 않습니다.

구분	연간 관리목표	금년 도달 증가	확보값/목표 참고비	연말 증가 전망	전월 대비
공공주택	27,681호	13,287호	48.0%	48,090호	비교 기준본 미확보
신축매입주택	미확보	미확보	산정 불가	미확보	비교 기준본 미확보
민간 정비사업	3,178호	6,123호	192.7%	6,123호	비교 기준본 미확보
일반 민간주택	미확보	미확보	산정 불가	미확보	비교 기준본 미확보
기타 공급유형	미확보	미확보	산정 불가	미확보	비교 기준본 미확보
유형 미확인·복합	미확보	0호	산정 불가	1,458호	비교 기준본 미확보
전체 (중복 제외)	30,859호	19,410호	62.9%	55,671호	비교 기준본 미확보

공급유형 대응표

공공택지·3기 신도시는 공공주택의 세부 분류이며 상위 합계와 중복 가산하지 않습니다.

원장 분류	보고서 분류	합산 원칙
PUBLIC	공공주택	대표 사업별 1회
PURCHASE_NEW	신축매입주택	대표 사업별 1회
PRIVATE_RENEWAL	민간 정비사업	대표 사업별 1회
OTHER_PRIVATE	일반 민간주택	대표 사업별 1회
OTHER	기타 공급유형	대표 사업별 1회
UNKNOWN	유형 미확인·복합	미확인·복합을 임의 배분하지 않음

공공주택 착공 세부현황

추정된 날짜는 실제 착공 확인일로 해석하지 않습니다. 계약·사업승인만으로 착공을 생성하지 않습니다.

지역 / 사업·블록	시행기관	세부 유형	착공 도달량	확인 사건일	당초 / 변경 예정	확인 상태
경기도 고양시 / 고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 S-1	LH	기타 공공주택	869호	2025-02-25	2025-02-25 / 2025-02-25	단계 추정
경기도 고양시 / 고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 S-2	LH	기타 공공주택	945호	2024-11-11	2024-11-11 / 2024-11-11	단계 추정

지역 / 사업·블록	시행기관	세부 유형	착공 도달량	확인 사건일	당초 / 변경 예정	확인 상태
경기도 고양시 / 고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 A-04	LH	3기 신도시	900호	2024-10-31	2024-10-31 / 2024-10-31	단계 추정
경기도 고양시 / 고양창릉 B1 B1	LH	3기 신도시	미확보	실제 착공일 미확보	미확보 / 2026-12	후행 근거 또는 미확보
경기도 고양시 / 고양창릉 S-01 S-01	LH	3기 신도시	494호	2025-12-31	2025-12-31 / 2025-12-31	원천 사건
경기도 고양시 / 고양창릉 S-02 S-02	LH	3기 신도시	1,057호	2025-09-30	2025-09-30 / 2025-09-30	단계 추정
경기도 고양시 / 고양창릉 S-03 S-03	LH	3기 신도시	1,282호	2026-04-15	2026-04-15 / 2026-04-15	단계 추정
경기도 고양시 / 고양창릉 S-04 S-04	LH	3기 신도시	1,024호	2026-03-31	2026-03-31 / 2026-03-31	단계 추정
경기도 고양시 / 고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 S-05	LH	3기 신도시	759호	2024-10-31	2024-10-31 / 2024-10-31	단계 추정
경기도 고양시 / 고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 S-06	LH	3기 신도시	430호	2024-10-31	2024-10-31 / 2024-10-31	단계 추정
경기도 과천시 / 과천주암(뉴스테이) C2 C2	LH	기타 공공주택	344호	2024-12-31	2024-12-31 / 2024-12-31	단계 추정
경기도 과천시 / 과천지식정보타운 S-12 S-12	LH	기타 공공주택	1,424호	2024-12-31	2024-12-31 / 2024-12-31	단계 추정

주요 12행 / 전체 165행. 전 사업 단계·일정은 붙임 2, 전체 표는 CSV·JSON에서 확인할 수 있습니다.

신축매입·민간정비·일반민간 지역별

지역	유형	금년 착공 증가	연말 누적 전망
서울특별시	신축매입주택	미확보	미확보
서울특별시	민간 정비사업	6,123호	6,123호
서울특별시	일반 민간주택	미확보	미확보
경기도	신축매입주택	미확보	미확보
경기도	민간 정비사업	미확보	미확보

지역	유형	금년 착공 증가	연말 누적 전망
경기도	일반 민간주택	미확보	미확보
인천광역시	신축매입주택	미확보	미확보
인천광역시	민간 정비사업	미확보	미확보
인천광역시	일반 민간주택	미확보	미확보

3. 주요 사업별 추진상황

주요 사업 현황

담당자 고정 지정 → 공급규모 순. 전 사업 및 단계별 근거는 붙임 2·3. 최근 단계 변경·지연·향후 일정 사업은 아래 표와 7장에 별도 표시합니다.

사업명 / 지역	관리물량	현재 단계	주요 실적	다음 일정	상태
서울 서리풀 / 서울특별시 서초구	20,000호	사업화	사업화 20,000호	2027-12-27 인허가	도래 목표 점검
과천과천 공공주택지구 / 경기도 과천시	10,000호	사업화	사업화 10,000호	2027-12-27 인허가	도래 목표 점검
수서 노후 임대 재건축 / 서울특별시 강남구	3,899호	사업화	사업화 3,899호	2028-12-31 인허가	도래 목표 점검
제물포 도심공공복합 / 인천광역시 미추홀구	3,500호	인허가	인허가 3,497호	2026-12-31 착공	도래 목표 점검
가양 노후 임대 재건축 / 서울특별시 강서구	3,235호	사업화	사업화 3,235호	2027-12-31 인허가	도래 목표 점검
중계본동 / 서울특별시 노원구	3,178호	착공	착공 3,178호	2027-07-01 공급·분양	도래 목표 점검
번동2단지 / 서울특별시 강북구	3,048호	사업화	사업화 3,048호	2028-12-26 인허가	도래 목표 점검
성대야구장 / 서울특별시 도봉구	1,800호	사업화	사업화 1,800호	2028-12-26 인허가	도래 목표 점검

보고기간의 단계 사건

같은 사업의 반복 사건 물량을 합산하지 않습니다. 사건 등록 사유는 물량 증감 원인과 다를 수 있습니다. 분할·통합·귀속 변경의 전후 원장이 없으면 변경 원인을 확정하지 않습니다.

사업	사건	일자	물량	확인 상태	등록 사유
고양창릉 S-01	인허가	2026-01-15	494호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
고양창릉 S-01	공급·분양	2026-04-30	494호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정

사업	사건	일자	물량	확인 상태	등록 사유
고양창릉 S-01	인허가	2026-01-15	494호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
고양창릉 S-01	공급·분양	2026-04-30	494호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
고양창릉 S-03	착공	2026-04-15	1,282호	단계 추정	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
고양창릉 S-03	공급·분양	2026-06-30	1,282호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
고양창릉 S-03	착공	2026-04-15	1,282호	단계 추정	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
고양창릉 S-03	공급·분양	2026-06-30	1,282호	단계 추정	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
고양창릉 S-04	착공	2026-03-31	1,024호	단계 추정	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
고양창릉 S-04	공급·분양	2026-06-30	1,024호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정

사업	사건	일자	물량	확인 상태	등록 사유
고양창릉 S-04	착공	2026-03-31	1,024호	단계 추정	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
고양창릉 S-04	공급·분양	2026-06-30	1,024호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정

주요 12행 / 전체 119행. 전 사업 단계·일정은 붙임 2, 전체 표는 CSV·JSON에서 확인할 수 있습니다.

4. 분양·임대 공급 추진현황

분기별 공급·모집

분기 실적은 신규 누적 도달 증가분(채택·추정 포함)입니다. 정정·추가 모집은 동일 사업 누적 최대와 관리 한도 내에서 처리하며 원천 모집공고 확인량은 아래에 별도 표시합니다.

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	4분기 잔여 계획
공공분양	미확보	7,795호	3,111호	0호	5,725호
공공임대	0호	956호	2,450호	350호	2,253호
기타·미확인	381호	0호	0호	1,305호	2,937호

원천 사건으로 확인된 공급 구성

누적 기준. 담당자 채택은 공식 모집공고 원문 확인과 동일한 뜻이 아닙니다. 원문·입력 규칙은 붙임 3에서 확인합니다.

구분	원천 사건·담당자 채택	추정·후행 근거	확인 필요
공공분양	10,343호	563호	0호
공공임대	4,377호	0호	0호
기타·미확인	15,893호	4,234호	0호

주요 공급예정 사업

전체 사업호수와 분양·임대 부분호수는 합산하지 않습니다. 오피스텔은 실 단위를 병기하고 기존 원장의 관리 호수 환산 여부를 확인 대상으로 표시합니다.

지역	사업지구·블록	유형 / 단위	계획량	예정시기	공고·도달 확인
경기도	광교 A17BL 민간참여 공공주택사업	공공분양 / 호	600	2026-10-30	미확보
경기도 과천시	과천지식정보타운 S-12 S-12	공공임대 / 호	1,424	2026-10-31	미확보
경기도 남양주시	남양주왕숙 A-17 A-17	공공분양 / 호	379	2026-10-31	미확보
경기도 시흥시	시흥거모 S1 S1	공공분양 / 호	300	2026-10-31	미확보
경기도 안산시	안산신길2 A6 A6	공공분양 / 호	251	2026-10-31	미확보
경기도 안산시	안산신길2 B1 B1	공공분양 / 호	387	2026-10-31	미확보
인천광역시 부평구	인천부평(도시재생뉴딜) A	공공임대 / 호	350	2026-10-31	350호
인천광역시 영종구	인천영종 A62 A62	공공분양 / 호	792	2026-10-31	미확보
경기도 부천시	부천종합운동장 역세권 A1 A1	기타·미확인 / 호	293	2026-11-14	미확보

지역	사업지구·블록	유형 / 단위	계획량	예정시기	공고·도달 확인
경기도 부천시	부천종합운동장 역세권 A2 A2	기타·미확인 / 호	550	2026-11-14	미확보
인천광역시 계양구	조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구 A10	기타·미확인 / 호	778	2026-11-14	미확보
경기도 의정부시	의정부법조타운 S3 S3	공공분양 / 호	544	2026-11-16	미확보

주요 12행 / 전체 26행. 전 사업 단계·일정은 붙임 2, 전체 표는 CSV·JSON에서 확인할 수 있습니다.

5. 준공·입주 추진현황 및 전망

준공 예정 및 확인

당초 예정은 연결된 기준선이 있는 일정만 비교합니다. 기준선 누락 또는 연도 이동은 전후 판본 연결이 필요합니다. 준공과 입주는 별도 사건입니다.

지역	연도	당초 예정	현재 예정	준공 도달	변경량
경기도	2026	미확보	3,140호	316호	비교 미확보
경기도	2027	미확보	18,989호	미도래	비교 미확보
서울특별시	2026	미확보	1,994호	381호	비교 미확보
서울특별시	2027	미확보	499호	미도래	비교 미확보
인천광역시	2026	2,682호	2,682호	미확보	0호
인천광역시	2027	미확보	3,356호	미도래	비교 미확보

입주 예정 및 시작 확인

입주 시작일 확인 사업의 물량은 실제 거주 세대수와 다릅니다. 준공·사용승인으로 실입주를 자동 생성하지 않습니다.

지역	유형	금년 입주예정	차년도 입주예정	입주 시작 도달	실입주
경기도	공공주택	1,163호	8,157호	미확보	실입주 자료 미확보
경기도	유형 미확인·복합	미확보	미확보	미확보	실입주 자료 미확보
서울특별시	공공주택	미확보	2,398호	미확보	실입주 자료 미확보
서울특별시	유형 미확인·복합	미확보	미확보	미확보	실입주 자료 미확보
서울특별시	민간 정비사업	미확보	미확보	미확보	실입주 자료 미확보
인천광역시	공공주택	1,224호	1,323호	미확보	실입주 자료 미확보
인천광역시	유형 미확인·복합	1,458호	미확보	미확보	실입주 자료 미확보

6. 정책·프로그램별 과제 이행현황

□ 프로그램별 주요 성과는 연결 사업의 단계 사건으로, 개선과제는 도래 목표 부족·미확보 및 예정 일정으로 확인합니다. 변경 사유가 없는 경우 원인을 추측하지 않습니다.

프로그램별 추진현황

대표 관리사업의 승인된 주 귀속 프로그램 기준. 관련성만 있는 프로그램에는 전체 물량을 중복 가산하지 않습니다. 목표는 프로그램의 정의된 단계·기간·단위와 일치할 때만 비교합니다.

프로그램	목표물량	관리사업	현재 단계별 성과	목표 대비	중점 관리
공공주택 건설	55,235호	40	사업화 27,350호 / 인허가 27,350호 / 착공 27,350호 / 공급·분양 10,908호 / 준공 미확보 / 입주 미확보	0.0%	26개 단계 점검
3기 신도시	26,585호	24	사업화 18,177호 / 인허가 18,177호 / 착공 17,798호 / 공급·분양 10,751호 / 준공 미확보 / 입주 미확보	17.4%	4개 단계 점검
LH 직접시행 전환·토지이용 효율화	60,000호	19	사업화 11,679호 / 인허가 8,854호 / 착공 2,853호 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	4.8%	4개 단계 점검
서울 남부권 공공택지 공급 조기화	30,000호	2	사업화 30,000호 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
건설형 공공임대	8,072호	27	사업화 9,335호 / 인허가 9,335호 / 착공 8,737호 / 공급·분양 3,543호 / 준공 미확보 / 입주 미확보	14.4%	15개 단계 점검
공공주택 후보	미확보	1	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	2개 단계 점검

프로그램	목표물량	관리사업	현재 단계별 성과	목표 대비	중점 관리
GH 통합공공임대	834호	2	사업화 834호 / 인허가 834호 / 착공 316호 / 공급·분양 834호 / 준공 316호 / 입주 미확보	0.0%	0개 단계 점검
공공택지·공공분양	16,936호	31	사업화 16,712호 / 인허가 16,712호 / 착공 13,730호 / 공급·분양 6,608호 / 준공 미확보 / 입주 미확보	27.5%	9개 단계 점검
철도역 등 활용 주택 공급	1,689호	3	사업화 1,689호 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
우수입지 공공택지 분양	32,000호	2	사업화 1,080호 / 인허가 1,080호 / 착공 1,080호 / 공급·분양 1,080호 / 준공 미확보 / 입주 미확보	3.4%	0개 단계 점검
노후 공공임대주택 전면 재건축	23,000호	6	사업화 13,251호 / 인허가 1,699호 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
도심 내 유휴부지 활용 공급	4,000호	4	사업화 4,058호 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
토지임대부	1,686호	2	사업화 1,686호 / 인허가 1,686호 / 착공 1,686호 / 공급·분양 1,686호 / 준공 381호 / 입주 미확보	0.0%	0개 단계 점검
민간정비 후보	미확보	3	사업화 6,123호 / 인허가 6,123호 / 착공 6,123호 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
인천도시공사(iH) 통합공공임대	미확보	2	사업화 1,441호 / 인허가 435호 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검

프로그램	목표물량	관리사업	현재 단계별 성과	목표 대비	중점 관리
인천도시공사(iH) 주택건설 후보	미확보	1	사업화 1,458호 / 인허가 1,458호 / 착공 1,458호 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	2개 단계 점검
인천도시공사(iH) 공공분양	미확보	3	사업화 2,698호 / 인허가 1,190호 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
인천도시공사(iH) 공공분양, 공공임대(6년 분양전환)	미확보	1	사업화 1,032호 / 인허가 1,032호 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
유휴부지·노후청사 복합개발	139호	2	사업화 139호 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
공공택지 공급 조기화	563호	1	사업화 563호 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
공공 도심복합사업 시즌2	50,000호	1	사업화 3,497호 / 인허가 3,497호 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
소규모주택정비사업 활성화	18,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
노후계획도시 정비사업	63,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
신축매입임대 공급 확대	140,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검

프로그램	목표물량	관리사업	현재 단계별 성과	목표 대비	중점 관리
학교용지 복합개발	3,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
공공택지 사업속도 제고	46,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
공공지원 민간임대 공급 확대	21,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
정비사업 제도 종합 개편	234,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
대학 유휴부지 연합 기숙사	4개소	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
노후 공공청사 등 재정비·복합개발	28,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
LH 소유 비주택용지 용도전환	15,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검

행정과제 이행현황

과제별 완료 근거 원장이 연결되지 않았습니다. 물량사업 진행률로 대체하거나 공식 브리프의 과제 건수를 복사하지 않습니다.

구분	전체	완료	진행	지연·점검필요
행정과제	미확보	미확보	미확보	미확보

7. 향후 주요 일정 및 중점 관리사항

향후 1·3·6개월 주요 일정

구간을 서로 겹치지 않게 표시합니다. 월·분기 일정의 관리 날짜는 정렬용이며 정확한 사건일로 확정하지 않습니다.

시기	지역·사업	예정 사건	물량	담당기관
1개월 내	경기도 / 광교 A17BL 민간참여 공공주택사업	공급·분양 · 2026-10-30	600호	미확보
1개월 내	인천광역시 검단구 / 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구	입주 · 2026-10-30	1,224호	LH
1개월 내	경기도 과천시 / 과천지식정보타운 S-12	공급·분양 · 2026-10-31	1,424호	LH
1개월 내	경기도 / 광교 A17BL 민간참여 공공주택사업	착공 · 2026-10-31	600호	미확보
1개월 내	경기도 남양주시 / 남양주 왕숙 A-17	착공 · 2026-10-31	379호	LH
1개월 내	경기도 남양주시 / 남양주 왕숙 A-17	공급·분양 · 2026-10-31	379호	LH
1개월 내	경기도 성남시 / 민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업	입주 · 2026-10-31	227호	LH
1개월 내	서울특별시 노원구 / 서울 공릉 1	준공 · 2026-10-31	294호	LH
1개월 내	경기도 시흥시 / 시흥거모 S1	공급·분양 · 2026-10-31	300호	LH
1개월 내	경기도 안산시 / 안산신길 2 A6	착공 · 2026-10-31	251호	LH
1개월 내	경기도 안산시 / 안산신길 2 A6	공급·분양 · 2026-10-31	251호	LH
1개월 내	경기도 안산시 / 안산신길 2 B1	공급·분양 · 2026-10-31	387호	LH

주요 12행 / 전체 77행. 전 사업 단계·일정은 붙임 2, 전체 표는 CSV·JSON에서 확인할 수 있습니다.

지연·위험 및 실적 확인 필요

기존 시스템 기준: 도래 목표 대비 부족률 2% 이상 지연, 0% 초과~2% 미만 주의. 미측정은 지연으로 단정하지 않습니다. 경과일은 현재 계

획 기한으로부터의 기간이며 실제 지연일 확정값과 다릅니다. 기준선은 담당자 채택 기준선일 수 있습니다.

사업 / 단계	상태	당초 / 변경 일정	경과일	원인	검토 필요사항
고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 / 공급·분양	판정 미확보	2025-05-10 / 2025-09-27	391일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
고양창릉 S-02 / 공급·분양	판정 미확보	2026-06-30 / 2026-06-30	115일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
과천주암(뉴스테이) C2 / 공급·분양	판정 미확보	2025-06-29 / 2025-11-16	341일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
광교 A17BL 민간참여 공공주택사업 / 사업화	판정 미확보	2023-09-06 / 2023-09-06	1143일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
광교 A17BL 민간참여 공공주택사업 / 인허가	판정 미확보	2026-07-20 / 2026-07-20	95일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
구리갈매역세권 A-1 / 공급·분양	판정 미확보	2025-06-29 / 2025-11-16	341일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
군포대야미 A1 / 공급·분양	주의	2026-06-30 / 2026-06-30	115일	원인 미확인	부족 1호 · 회복 일정 점검
군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 / 공급·분양	지연	2025-11-28 / 2025-11-28	329일	원인 미확인	부족 508호 · 회복 일정 점검
남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 (/ 공급·분양	판정 미확보	2026-03-29 / 2026-08-16	68일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / 공급·분양	지연	2026-10-31 / 2025-05-31	510일	원인 미확인	부족 111호 · 회복 일정 점검
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / 준공	판정 미확보	2026-10-31 / 2026-04-30	176일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 / 공급·분양	판정 미확보	2025-03-29 / 2025-08-16	433일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인

주요 12행 / 전체 62행. 전 사업 단계·일정은 붙임 2, 전체 표는 CSV·JSON에서 확인할 수 있습니다.

데이터 확인 필요 사업

확보된 원천의 미연결과 원천 자체 미확보는 별개의 상태입니다. 후보를 확정 실적으로 추가하지 않습니다.

확인 유형	확보 상태 / 조치
사업 동일성 확인 필요	선택 원장 대표 ID 중복 없음
정책 귀속 확인 필요	0개 · 미연결 후보는 본 집계 대상 아님
공급물량 상충	상충 후보 원장 미연결 · 전체 현황 산정 불가
전체·부분 물량 관계 미확정	1개 복합 유형 · 별도 확인
원천 수집 또는 문서 추출 미완료	선택 원장 밖의 수집 대기 목록 미연결 · 없음으로 간주하지 않음
담당자 승인 대기	0개 · 선택 원장 범위
원천 확보·귀속 미확정 후보	미연결 후보 현황은 정책 확정 실적과 분리 · 후보 목록 미연결
단위 확인	0개 실 단위 사업 · 기존 관리 원장과 호 단위 환산 검토
